



KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

**2023 YILI
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**



İÇİNDEKİLER

1.	YÖNETİCİ ÖZETİ.....	4
2.	GENEL DEĞERLENDİRME.....	5
	2.1. MİSYON.....	5
	2.2. VİZYON.....	5
	2.3. TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER.....	6
	2.4. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	7
	2.5. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ.....	7
	2.5.1 TAŞINMAZLARININ DAĞILIMI.....	9
	2.5.2 AÇIK ALANLARIN DAĞILIMI.....	10
	2.5.3 KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI.....	10
	2.6. 2023 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....	11
	2.6.1 GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU.....	11
	2.6.2 YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR	12
3.	2023 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	12
	3.1 DEVAM EDEN PROJELER	12
	3.1.1 KAMPÜS ALTYAPI PROJESİ	12
	3.1.2 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ	13
	3.1.3 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ.....	14
	3.2 TAMAMLANAN PROJELER	17
	3.2.1 YAYIN ALIMI PROJESİ	17
	3.2.2 MUHTELİF İŞLER PROJESİ	18
	3.2.3 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ.....	18
4.	TABLO VE RESİM	
	Tablo 1. PERSONEL SAYILARI.....	8
	Tablo 2. TAŞINMAZLARIN DAĞILIMI.....	9
	Tablo3. 2023 YILI YATIRIM HARCAMALARIN BÜTÇE ÖDENEK ÖDENEK DAĞILIMLARI.....	11
	Resim 1.	13
	Resim 2.....	15
	Resim3.....	15
	Tamamlanan Projeler.....	19
	2023 YILI YATIRIM HARCAMALARI IV. DÖNEM SONU GERÇEKLEŞTİRME RAPORU.....	20
	2023 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU.....	21

1. Yönetici Özeti



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizat ile donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi gereğince hazırlanan Üniversitemiz 2023 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Prof. Dr. Fatih KIRIŞIK
Rektör



2. Genel Değerlendirme

2.1. Misyon

Geleceğin mesleklerine uygun kaliteli eğitim.

2.2. Vizyon

Uluslararasılaşmada lider üniversite olmak.

2.3. Temel Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaç 1: Uluslararası Bir Üniversite Olmak

- H.1.1 Plan dönemi sonuna kadar en az üç bölüm için 2+2 eğitim modelini hayata geçirmek
- H.1.2 Plan dönemi sonuna kadar en az iki ülkede yurtdışı mikro kampüs oluşturmak.
- H.1.3 Akademik personel hareketliliğini arttırmak
- H.1.4 Uluslararası öğrenci hareketliliğini arttırmak.
- H.1.5 Üniversitedeki uluslararası öğretim elemanı ve öğrenci sayısını arttırmak.
- H.1.6 Plan dönemi sonuna kadar yabancı dilde eğitim verilen bölüm/program sayısını arttırmak.

Stratejik Amaç 2: Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinde Kaliteyi Arttırmak

- H.2.1 Geleceğin mesleklerine yönelik eğitim-öğretimi desteklemek.
- H.2.2 Plan dönemi sonuna kadar en az 10 bölüm/program akredite etmek.
- H.2.3 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını düşürmek.
- H.2.4 Lisansüstü öğrenci sayısını arttırmak.
- H.2.5 Eğitim Öğretim fiziksel altyapısını iyileştirmek ve tamamlamak.

Stratejik Amaç 3: Ar-Ge Altyapı ve Potansiyelini Güçlendirmek

- H.3.1 Ulusal ve Uluslararası indekslerde taranan dergilerdeki yayın sayısını arttırmak.
- H.3.2 Araştırma Geliştirme proje sayısı ve çeşitliliğini arttırmak.

Stratejik Amaç 4: Üniversitemizdeki Girişimcilik Kültürünü Yaygınlaştırmak

- H.4.1 Teknokent'teki işletme sayısını arttırmak.
- H.4.2 Girişimci öğrenciler yetiştirmek.

Stratejik Amaç 5: Toplumsal Katkı Sağlamaya Yönelik Hizmetleri Arttırmak

- H.5.1 Toplumsal katkı sağlamak amacıyla yapılan etkinliklerin sayısını arttırmak.
- H.5.2 Hayat boyu öğrenme kapsamında topluma yönelik eğitim/danışmanlık/sertifika programları düzenlemek
- H.5.3 Ekolojik kampüs anlayışını yaygınlaştırmak

2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin "A-Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri" içerisinde sayılmış olup merkezi yönetim içerisinde yer alan özel bütçeli bir kurumdur.

Üniversitemiz 2023 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödeneği 55.000.000 TL olup, başlangıç ödeneğinin tamamı hazine yardımı (sermaye) kaynaklıdır. Yıl içerisinde 29.353.201 TL ekleme yapılarak toplam ödenek 84.353.201 TL olarak revize edilmiştir. Yatırım bütçesine eklenen tutarın 22.600.000 TL'si likit değerlerimizden, 6.400.000 TL'si öz gelirlerimizden, 353.201 TL'si de YÖK tarafından Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz için aktarılan eğitim desteğinden oluşmaktadır.

2.5. Mevcut Üretim Kapasitesi

Üniversitemiz, 29 Mayıs 2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5662 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile kurulmuştur.

Üniversitemizde 16 Fakülte, 2 Enstitü, 5 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu ve 17 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

2023 yılında Üniversitemizde 45.890 öğrenci, 1.106 akademik, 39 yabancı uyruklu akademik, 629 idari, 73 4/B sözleşmeli personel, 289 4/D sürekli işçi ve 24 geçici işçi olmak üzere toplam 2.160 personel bulunmaktadır.

Tablo 1. Personel Sayıları

Personel	2021	2022	2023	2023 Yılıın Bir Önceki Yıla Göre Değişimi (%)
Akademik Personel	1.068	1.108	1.106	-0,18
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	60	48	39	-23,08
İdari Personel	474	481	629	23,53
4/B Sözleşmeli Personel*	-	173	73	-136,99
4/D Sürekli İşçi	293	288	289	0,35
Geçici İşçi	26	24	24	0
Toplam	1.921	2.122	2.160	1,76

Kaynak: 2023 Yılı Faaliyet Raporu

**20 Ocak 2023 tarih ve 32085 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 7433 Sayılı Kanuna istinaden Üniversitemizde görev yapan 4/B Sözleşmeli Personelin kadroya ataması gerçekleştirilmiştir.*

2.5.1. Taşınmazlarının Dağılımı

Tablo 2. Karabük Üniversitesi Fiziki Alanların Dağılımı

Hizmet Alanı (m ²)	Demir Çelik Yerleşkesi	Safranbolu Yerleşkesi	Eskipazar Yerleşkesi	Yenice Yerleşkesi	Eflani Yerleşkesi	TOBB Yerleşkesi	Ovacık Yerleşkesi	Diğer Taşınmazlar	Toplam (m ²)
Eğitim	26.175,84	7.013,80	532,07	958,01	1.078,90	1.224,88	958,01	882	38.823,51
Barınma	-	1.300	1.260	-	720	-	-	5.760	9.040,00
Yemekhane	4.381,90	1.476,11	367,50	101,14	352,17	498,62	101,14	-	7.278,58
*Laboratuvar	6.343,34	1.486,56	232,08	248,27	288,58	2.634,22	248,27	-	11.481,32
Akademik/ İdari Çalışma Odası	23.715,76	4.815,11	478,17	688,86	242,19	1.157,74	-	-	31.097,83
Spor	32.433,50	-	1.816,19	-	1.097,32	-	-	-	35.347,01
Konferans/ Toplantı Salonu	4.434,29	1.799,87	99,29	137,06	45,55	277	-	-	6.793,06
Depo/Arşiv	5.682,29	1.168,77	398,47	163,10	591,46	422,56	-	-	8.426,65
Kütüphane	2.083,56	479,60	74,52	29,75	45,55	18,80	-	-	2.731,80
Kafeterya/ Kantin	1.156,71	575,64	20,80	126,85	99,28	301,53	-	-	2.280,81
Diğer	61.857,90	12.566,86	1.261,36	1.601,11	953,77	3.802,86	1.601,11	-	83.644,97
Açık Alan	627.016,91	13.164,14	70.904,49	6.290,94	97.906,97	42.805,70	5.059,11	-	863.148,26
Kapalı Alan	168.265,09	32.682,32	6.540,45	4.054,15	5.514,77	10.338,21	2.908,53	6.642,00	236.945,54

Kaynak: 2023 Yılı Faaliyet Raporu

*20.800 m² alanda inşa edilen Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası bodrum, zemin ve üç kattan oluşmakta olup, içerisinde 78 adet laboratuvar, 4 idari ofis, 2 toplantı odası, 1 seminer salonu ve öğretim elemanı odaları bulunmaktadır.

2.5.2 Açık Alanların Dağılımı



Şekil 1. Karabük Üniversitesi Taşınmazlarının (Açık Alan) Dağılımı (Kaynak: 2023 Yılı Faaliyet Raporu)

2.5.3 Kapalı Alanların Dağılımı



Şekil 2. Karabük Üniversitesi Taşınmazlarının (Kapalı Alan) Dağılımı (Kaynak: 2023 Yılı Faaliyet Raporu)

Üniversitemiz kapalı alanları toplamı 236.945,54 m²'dir. Toplam kapalı alanın % 71'ini 168,265 m²'lik alan ile Demir Çelik Yerleşkesi (Karabük Merkez Kampüs) oluşturmaktadır.

2.6. 2023 Yılı Yatırım Uygulamaları


2.6.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemiz 2023 Yatırım Programında 6 proje yer almaktadır. Bu projelerden 5'i Eğitim-Yükseköğretim sektöründe, bir tanesi de Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor sektöründedir. Projeler için 55.000.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiş, yıl içerisinde yapılan aktarma ve eklemeler sonucu projelerin toplam ödeneği 84.353.201 TL olarak revize edilmiştir. Yıl sonuna kadar toplam proje ödeneğinin %72'lik kısmına tekabül eden 60.339.688 TL'lik kısmı harcanmıştır.

Tablo 3. 2023 Yılı Yatırım Harcamalarının Bütçe Ödenek Dağılımları

Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Revizeli Ödeneği	Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı %
06. Sermaye Giderleri	55.000.000,00	84.353.201,03	60.339.688,37	71,53
06.01 Mamul Mal Alımı	6.900.000,00	15.867.139,43	15.374.206,85	96,89
06.03 Gayri Maddi Alımları	1.700.000,00	1.832.241,00	1.341.326,85	73,21
06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	38.998.000,00	60.798.000,00	41.864.865,53	68,86
06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	302.000,00	505.820,60	394.284,40	77,95
06.07 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri	7.100.000,00	5.350.000,00	1.365.004,74	25,51

Kaynak: 2023 Yılı Faaliyet Raporu

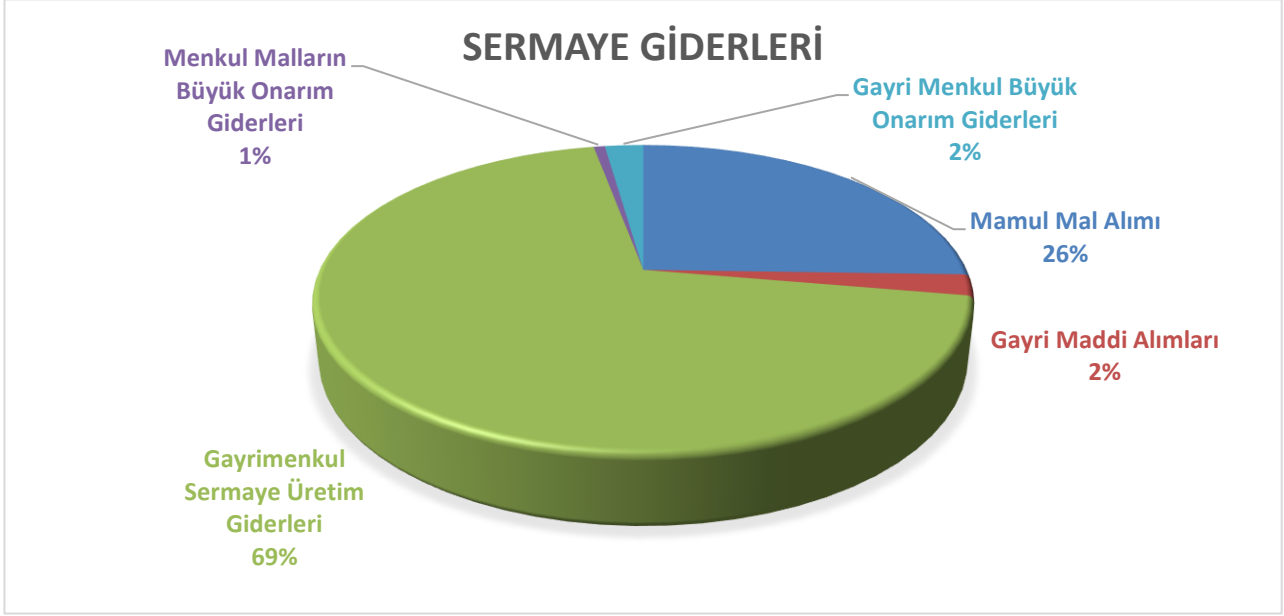

Şekil 3. 2023 Yılı Yatırım Harcamalarının Bütçe Ödenek Dağılımları

2.6.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

İş planlarımız doğrultusunda hazırlanarak Üniversitemizce teklif edilen ancak kendi nakit imkanları doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca revize edilerek onaylanan Ayrıntılı Finans Programı (AFP) çerçevesinde ödemelerin zamanında yapılamaması hususunda sıkıntılar yaşanabilmektedir. Yine 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması ve itirazlar nedeniyle ihalelerin geç sonuçlanması yatırım uygulamalarında karşılaştığımız temel sorunların başında gelmektedir.


3. 2023 Yılı Proje Uygulamaları

3.1. Devam Eden Projeler

3.1.1. Kampüs Altyapı Projesi

75.750.000 TL proje bedelli Kampüs Altyapısı Projesinin 2023 yılı başlangıç ödeneği 20.000.000 TL'dir. Altyapı projesi kapsamında 2023 yılında "Fore Kazık ve Kanalizasyon Yapım Hattı" işi ihale edilmiş, bu iş için KDV hariç 9.561.000 TL üzerinden sözleşme imzalanmış, KDV hariç 9.472.337 TL ödeme yapılmış ve sözleşmeye konu iş tamamlanmıştır.

Diğer altyapı harcamalarıyla birlikte 2023 yılında tahsis edilen ödeneğin 18.696.737 TL'si harcanmış olup, harcamanın yılı proje ödeneğine oranı %93,48 olarak gerçekleşmiştir.

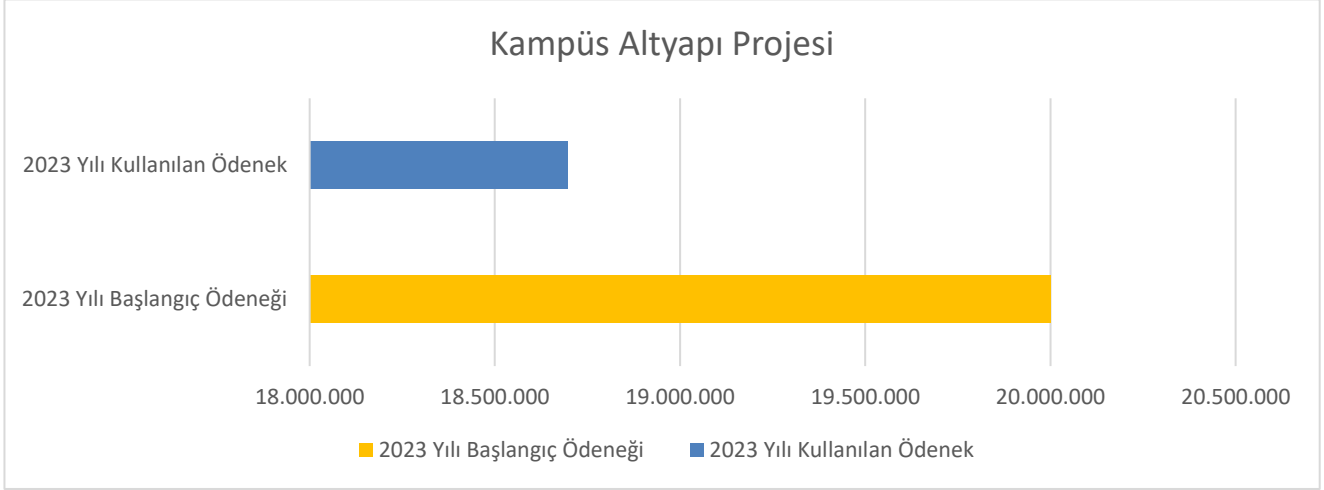

Şekil 4. Kampüs Altyapı Projesinin 2023 Yılı Başlangıç Ödeneği Harcama Tablosu


3.1.2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Ovacık Spor MYO Binası

21.242.616 TL proje bedelli Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin 2023 yılı başlangıç ödeneği 14.000.000 TL'dir. Proje; Ovacık Spor MYO Binası (4.540 m²) olmak üzere 1 alt projeyi kapsamaktadır. Fiziki gerçekleşmesi %94'ü bulan yapım işine 2023 Yılında tahsis edilen ödeneğin 9.604.174 TL'si harcanmıştır. İşin 2023 yılı sonu itibariyle bitirilmesi hedeflenirken yüklenici firmanın iş programına uygun hareket etmemesi nedeniyle iş programının gerisinde kalınmıştır. Yılı harcamasının 2023 yılı proje ödeneğine oranı %68,60 olarak gerçekleşmiş olup, proje tamamlanamamış ve 2.000 TL iz ödenekle 2024 Yılı Yatırım Programına alınmıştır.




Resim 1. Ovacık Spor Meslek Yüksekokulu

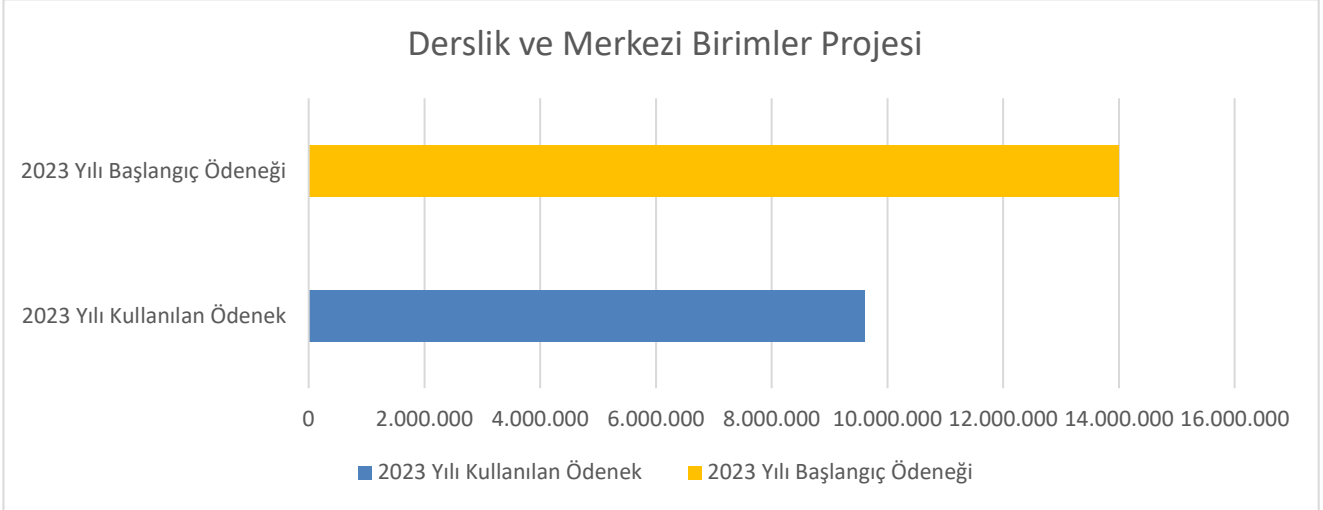

Şekil 5. Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin 2023 Yılı Başlangıç Ödeneği Harcama Tablosu

3.1.3. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

2023 yılı proje bedeli 110.000.000 TL olan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesinin başlangıç ödeneği 4.998.000 TL'dir. Alt proje olan Spor Kompleksi İkmal İnşaatı ihalesine 2022 yılı Ağustos ayında çıkmıştır. Proje ödeneğine 2023 yılı içerisinde yapılan 17.500.000 TL likit ekleme işlemi ile proje ödeneği 22.498.000 TL olarak revize edilmiştir. Fiziki gerçekleşmesi %15'i bulan Spor Kompleksi Yapım İşine yıl içerisinde 10.354.219 TL harcama yapılmış olup, yüklenici firmanın adı geçen iş programına uygun hareket etmemesi nedeniyle iş programının gerisinde kalınmıştır. 2023 yılında yapılan harcamanın yılı ödenğe oranı %46,02'dir. Söz konusu yapım işinin bitirilebilmesi için gereken ödenek temin edilebilirse 2024 yılında tamamlanarak yıl sonuna kadar hizmete açılması planlanmaktadır.

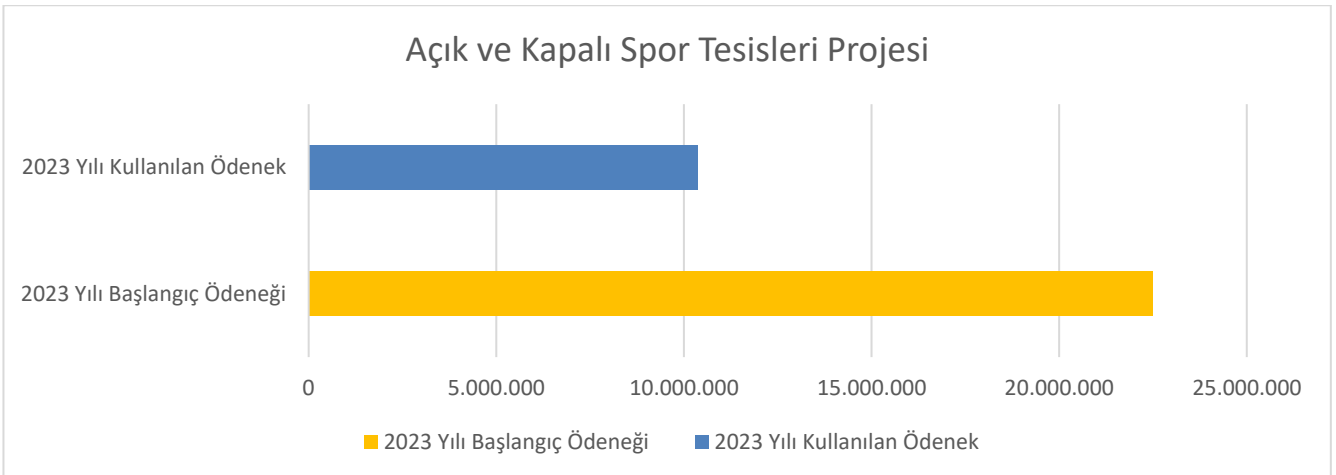

Şekil 6. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin 2023 Yılı Başlangıç Ödeneği Harcama Tablosu



Resim 2. Spor Tesisleri



Resim 3. Spor Tesisleri

Devam Eden Projeler


Proje No	Projenin Adı	Karakteristik	Başlama Bitiş	Proje Tutarı	(A) 2023 Öncesi Toplam Harcama	2023 Kesintili Başlangıç Ödeneği	2023 Revize Toplamı	(B) 2023 Toplam Harcama	(A+B) Toplam Harcama	Projenin Fiziki Gerçekleşme Oranı
2023H03- 212566	Kampüs Altyapı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol,Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2023-2025	75.750.000	0	20.000.000	20.000.000	18.696.737	18.696.737	% 35
2009H03-1055	Derslik ve Merkezi Birimler / Ovacık Spor MYO Binası (4.540 m2)	Eğitim (4.540 m ²)	2009-2023	21.242.616	7.242.616	14.000.000	14.000.000	9.604.175	16.846.791	% 94
2014H05-2051	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Spor Kompleksi (14.200 m ²)	2014-2025	110.000.000	5.000.000	4.998.000	22.500.000	10.354.219	15.354.219	% 15
TOPLAM				206.992.616	12.242.616	38.998.000	56.500.000	38.655.131	50.897.747	

3.2. Tamamlanan Projeler

3.2.1. Yayın Alımı Projesi

2023 yılı proje bedeli ve başlangıç ödeneği 1.500.000 TL'dir. Yıl içerisinde projeden farklı bir projeye yapılan aktarma yapılmamıştır. Ödeneğin 1.266.373 TL'si, basılı yayın alımları ve yapımları, elektronik ortamda yayın alımları ve yapımları ile diğer yayın alımları ve yapımlarına harcanmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı %84,42 olarak gerçekleşmiştir.


Yayın koleksiyonunun geliştirilmesi ve güncellenmesi doğrultusunda proje kapsamında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca 1.133 adet basılı yayın satın alınmış, ayrıca 2023 yılı için abone olunan Turcademy, HukukTürk, Legal Online, Bookcites, Lehcediz, İdealonline Süreli Yayınlar, MathSciNet, Sobiad, Vetis, Eikon, Grammarly, Nursing gibi veri tabanlarına yıllık abonelikler sağlanarak Kütüphane kullanıcılarının hizmetine sunulmuştur.

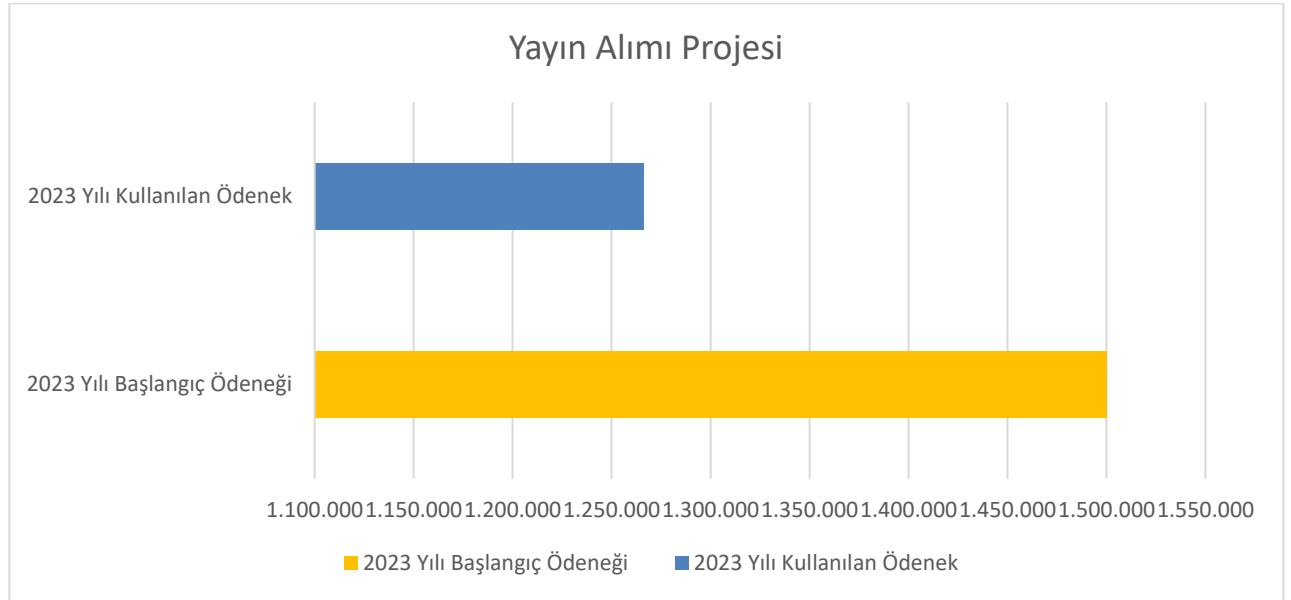

Şekil 7. Yayın Alma Projesinin 2023 Yılı Başlangıç Ödeneği Harcama Tablosu

3.2.2.Muhtelif İşler Projesi

2023 yılı proje bedeli ve başlangıç ödeneği 14.402.000 TL'dir. Eğitim ve hizmet binalarının teknolojik altyapısını güçlendirmek için makine-teçhizat, laboratuvar cihazı, bilgisayar ve yazıcı alımı, büro ve derslikler için tefrişat malzemesi alımı, internet altyapısını güçlendirmek için yazılım alımı, geçici kabulü yapılan laboratuvar binasının kesin hesap ödemesi, menkul malların büyük bakım onarımı ile gayrimenkul malların büyük bakım onarımları için 11.053.201 TL ekleme yapılarak proje ödeneği 25.455.201 TL olarak revize edilmiştir. İlave ödeneğin 4.300.000 TL'si likit değerlerden, 6.400.000 TL'si öz gelirlerden, 353.201 TL'si de YÖK kaynaklı OSB eğitim desteğinden kullanılmıştır. 2023 yılında toplam 20.418.183 TL harcama yapılmış, harcamanın ödeneye oranı %80,21 olarak gerçekleşmiştir.

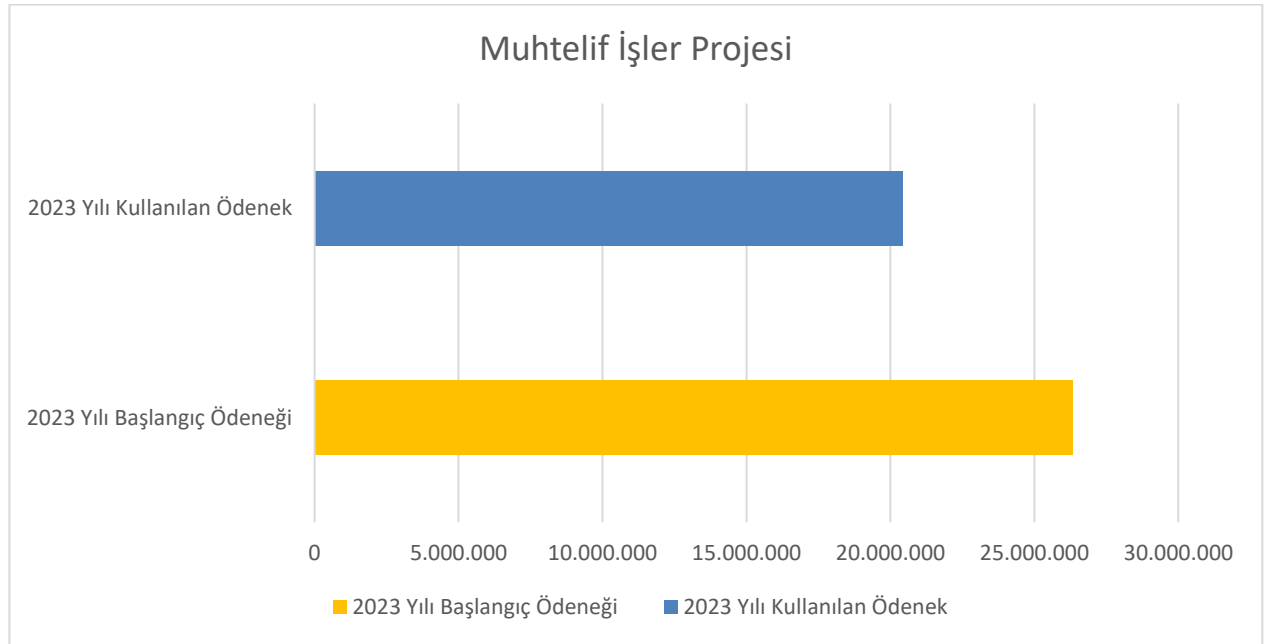

Şekil 8. Muhtelif İşler Projesinin 2023 Yılı Başlangıç Ödeneği Harcama Tablosu

3.2.3.Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Projenin 2023 yılı başlangıç ödeneği 100.000 TL'dir. Yıl içerisinde yapılan ekleme işlemi ile proje ödeneği 900.000 TL olarak yenilenmiştir.

Tamamlanan Projeler

Proje No	Projenin Adı	Karakteristik	Başlama Bitiş	Proje Tutarı	(A) 2023 Öncesi Toplam Harcama	2023 Kesintili Başlangıç Ödeneği	2023 Revize Toplamı	(B) 2022 Toplam Harcama	(A+B) Toplam Harcama	Projenin Fiziki Gerçekleşme Oranı
2023H03-212551	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2023-2023	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.266.373	1.266.373	% 100
2023H03- 212556	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine- Teçhizat	2023-2023	25.453.200	0	14.402.000	25.453.200	20.418.183	20.418.183	%100
2023H03- 212563	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Etüt-Proje	2023-2023	900.000	0	100.000	800.000	0	0	0
TOPLAM				27.853.200	0	16.002.000	27.253.200	21.684.556	21.684.556	% 100

2023 YILI YATIRIM HARCAMALARI IV. DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı : Karabük Üniversitesi
Sektör : Eğitim

Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı Toplamı	(A) 2023 Öncesi Kümülatif Harcama	2023 Revize Ödenek Toplamı	2023 Yılı Başlangıç Ödeneği(KBÖ)	(+)/(-)	Ekleme Miktarı	(B) 2023 Toplam Harcama	(A+B) Harcama Toplamı
254325	491	2023H03-212566	Kampüs Altyapı	2023-2025	Karabük	75.750.000	0	20.000.000	20.000.000		0	18.696.737	18.696.737
267354	491	2009H03-1055	Derslik ve Merkezi Birimler	2009-2023	Karabük	21.242.616	7.242.616	14.000.000	14.000.000		0	9.604.175	96.309.000
270532	491	2014H05-2051	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2014-2025	Karabük	110.000.000	5.000.000	22.498.000	4.998.000	(+)	17.500.000	10.354.219	15.354.219
244513	491	2023H03-212556	Muhtelif İşler	2023-2023	Karabük	25.455.202	0,00	25.455.201	14.402.000	(+)	11.053.201	20.418.183	20.418.183
244507	491	2023H03-212551	Yayın Alımı	2023-2023	Karabük	1.500.000	0,00	1.500.000	1.500.000		0	1.266.373	1.001.088
244501	491	2023H03-212563	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2023-2023	Karabük	900.000,00	0,00	900.000,00	100.000,00	(+)	900.000	0	0
TOPLAM						234.847.818	12.242.616	84.353.201	55.000.000		29.459.201	60.339.687	151.779.227

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kuruluş Adı : Karabük Üniversitesi
Sektör : Eğitim
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Dönem : 4. Dönem (Aralık Sonu)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2023 Sonu Kümülatif Harcama			2023 Yılı Program (KBÖ) Ödenek			2023 Yılı Revize Ödenek			2023 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
EĞİTİM	6		234.847.818		0	151.779.227			55.000.000			84.253.202			60.339.687
DİĞER	-		-		0	-			-			-			-
TOPLAM	6		234.847.818		0	151.779.227			55.000.000			84.253.202			60.339.687
