



KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

**2019 YILI
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**



*“Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan
gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.”*

M. Atatürk

İÇİNDEKİLER

1. YÖNETİCİ ÖZETİ	4
2. GENEL DEĞERLENDİRME.....	5
2.1. VİZYON.....	5
2.2. MİSYON.....	5
2.3. TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER	6
2.4. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	6
2.5. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ.....	7
2.6. 2019 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	9
3. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI	10
3.1. DEVAM EDEN PROJELER.....	10
3.2. TAMAMLANAN PROJELER	17

1. Yönetici Özeti



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizat ile donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi gereğince hazırlanan Üniversitemiz 2019 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Prof. Dr. Refik POLAT
Rektör



2. Genel Değerlendirme

2.1. Vizyon

Hayat boyu öğrenme kültürünü içselleştirmiş, bölgenin ve dünyanın gelişimine katkı sağlayan, nitelikli eğitim ve araştırma yapan, paydaş odaklı, tercih edilen, tanınırlığı yüksek bir üniversite olmaktır.

2.2. Misyon

Eğitim-öğretim, ar-ge ve topluma hizmet süreçlerinde paydaş odaklı; insani değerleri özümsemiş, sürekli öğrenen, girişimci bireyler yetiştirmektir.

2.3. Temel Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaç 1: Nitelikli eğitim vermek ve başarılı öğrencileri çekmek	
H.1.1	2020 yılına kadar 4 programın akreditesini sağlamak
H.1.2	Girişimci öğrenciler yetiştirmek
H.1.3	Web tabanlı eğitim teknolojilerini örgün eğitimi destekleyen bir unsur olarak yaygınlaştırmak
H.1.4	Akademik personel/öğrenci sayısını Türkiye ortalamasına yaklaştırmak
H.1.5	Akademik programların ve ders içeriklerinin ihtiyaçlar dikkate alınarak belli periyotlarla güncellenmesini sağlamak
H.1.6	Eğitim-öğretim için gerekli fiziki alanları ve araçları geliştirmek
H.1.7	Yabancı dilde eğitim verilen program ve derslerin sayısını ve niteliğini artırmak
Stratejik Amaç 2: Ar-ge altyapı ve süreçlerini iyileştirmek	
H.2.1	Nitelikli yayın sayısını artırmak
H.2.2	Ar-ge altyapı ve potansiyelini güçlendirmek
H.2.3	Proje finansman ve fonlarının etkin kullanımı
Stratejik Amaç 3: Öğrenci, çalışan ve diğer paydaşlara yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, mesleki faaliyet ve süreçleri geliştirmek	
H.3.1	Sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve mesleki faaliyetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak
H.3.2	Sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve mesleki faaliyetler memnuniyet oranlarını artırmak
H.3.3	Sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve mesleki faaliyetler için gerekli altyapıyı geliştirmek ve aktif kullanımını sağlamak
Stratejik Amaç 4: Ulusal ve uluslararası tanınırlığımızı artırmak	
H.4.1	Sivil toplum ve sektörle ilişkileri geliştirmek
H.4.2	Üniversite iletişim ve tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi
H.4.3	Uluslararası öğrencilerle iletişimi güçlendirmek
H.4.4	Dış paydaşlarla protokole dayalı ve AB projeleri kapsamında ilişkilerin geliştirilmesi
Stratejik Amaç 5: İdari ve yönetim süreçlerini iyileştirmek	
H.5.1	Hizmet içi eğitim olanaklarının geliştirilmesi ve görevde yükselme imkanlarının sağlanması
H.5.2	Üniversitemizde süreç yönetimini etkinleştirerek yetki ve sorumlulukları belirlemek
H.5.3	Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını kurumsallaştırmak
H.5.4	Personel motivasyonunu artırmak

2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi özel bütçeli bir kamu kuruluşu olup, yatırımlarının finansman kaynağı hazine yardımıdır.

2.5. Mevcut Üretim Kapasitesi

Üniversitemiz, 29 Mayıs 2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5662 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kurulmuştur.

Üniversitemizde 16 fakülte, 3 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar, 2 enstitü, 15 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır. Üniversitemizde 48.300 öğrenci eğitim görmekte, 1003 akademik, 467 idari personel ve 265 sürekli işçi görev yapmaktadır.

2.5.1. Taşınmazlarının Dağılımı

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m ²)			Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye / Hazine	Diğer		
Demir-Çelik Yerleşkesi (Merkez Kampüsü)	608.624,00	83.040,40	-	691.664,40	*
Safranbolu Yerleşkesi	2.915,00	17.033,00	-	19.948,00	** (839/5 parsel Kaymakamlığa Tahsisli)
Eskipazar Yerleşkesi	-	-	95.760,00	95.760,00	*** İl Özel İdaresi
Yenice Yerleşkesi	7.396,00	-	-	7.396,00	-
Eflani Yerleşkesi	-	-	101.076,00	101.076,00	*** İl Özel İdaresi
TOBB Yerleşkesi	-	-	46.662,00	46.662,00	**** Karorsan
Personel Lojmanları	8.100,00			8.100,00	
5000 Evler Yerleşkesi		5.278,00		5.278,00	
Ovacık Yerleşkesi		4.963,00		4.963,00	
Yenişehir Yerleşkesi	10.983,00	2.742,00		13.725,00	
Toplam	638.018,00	113.056,40	243.498,00	994.572,40	-

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı


(*) 5.700 m² açık alan Teknokent Aş tahsis edilmiştir

(**) Safranbolu Yerleşkesinde yer alan ve geçici olarak Safranbolu Turizm Fakültesine tahsis edilmiş olan 80 ada 172 parsel 2.000 m² alan üzerine kurulu 848 m² kapalı alana sahip tarihi taş bina, Milli Emlak Müdürlüğünce Sağlık Bakanlığından alınarak 29.01.2003 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesine süresiz tahsis edilmiş olup, 2007 yılında Üniversitemizin kurulmasıyla Karabük Üniversitesine devredilmiştir. (839/5 parsel Kaymakamlığa tahsis edilmiştir.)

(***) Eskipazar Meslek Yüksekokulu Yerleşkesini oluşturan YİBO (Yatılı İlköğretim Bölge Okulu) binası 20.01.2009 tarihinde, Eskipazar Anadolu Lisesi binası da, 11.08.2009 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üniversitemize geçici olarak tahsis edilmiştir.

(****) Eflani Meslek Yüksekokulu Yerleşkesini oluşturan 101 ada 5 parselde kayıtlı 101.000 m² alan üzerine kurulu YİBO (Yatılı İlköğretim Bölge Okulu) binası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üniversitemize süresiz tahsis edilmiştir.

(*****) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 5.892,00 m² alan üzerine kurulu, 2.100 m² kapalı alana sahip (arsa Karorsan tarafından tahsis edilmiş) hizmet binası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Üniversitemize tahsis edilmiştir.

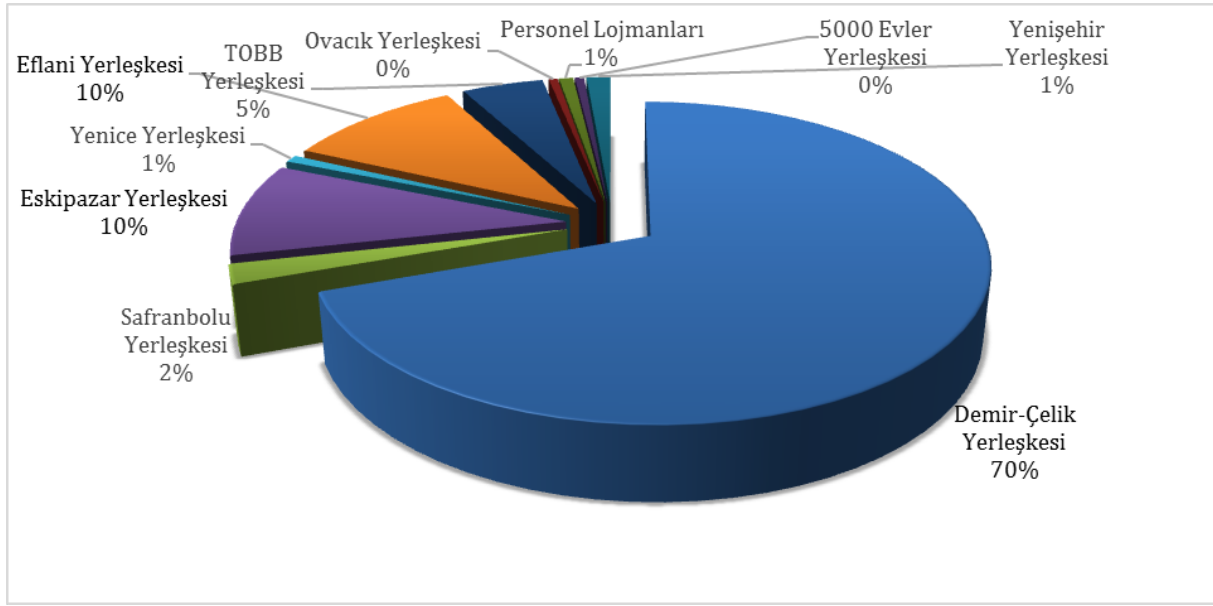


2.5.2 Kapalı Alanların Dağılımı

Üniversitemiz kapalı alanları toplamı 247.564 m²'dir. Toplam kapalı alanın %65'ini 159.764 m²'lik alan ile Demir Çelik Yerleşkesi (Karabük Merkez Kampüs) oluşturmaktadır.

Karabük Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m ²)			Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye / Hazine	Diğer		
Demir-Çelik Yerleşkesi (Merkez Kampüs)	159.764,00			159.764,00	
Safranbolu Yerleşkesi	650,00	27.654,00		28.304,00	
Eskipazar Yerleşkesi	-	-	21.844,00	21.844,00	Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Tahsisli
Yenice Yerleşkesi	4.424,00			4.424,00	
Eflani Yerleşkesi	-		3.865,00	3.865,00	Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Tahsisli
TOBB Yerleşkesi			5.892,00	5.892,00	Karorsan Tarafından Tahsisli
5000 Evler Yerleşkesi		10.540,00		10.540,00	
Ovacık Yerleşkesi		4.424,00		4.424,00	
Yenişehir Yerleşkesi	8.507,00	-		8.507,00	
Toplam	173.345,00	42.618,00	31.601,00	247.564,00	

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

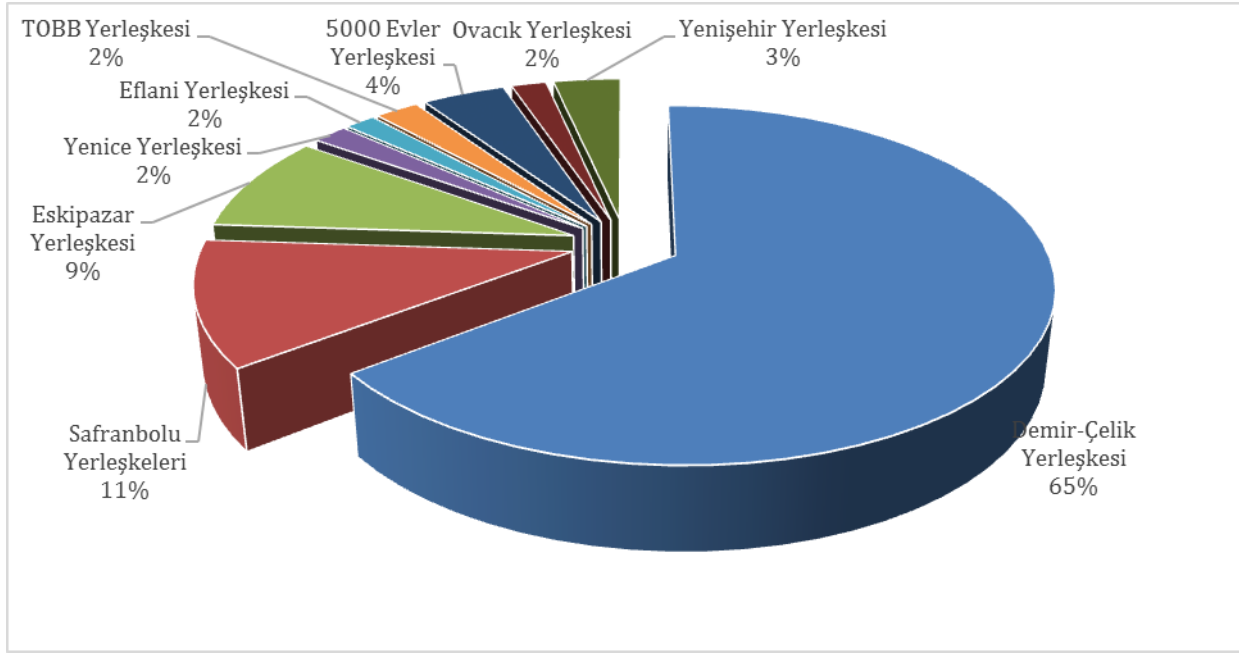

2.6. 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.6.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemiz 2019 Yatırım Programında 7 proje yer almakta olup, 20.500.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Başlangıç ödeneğine yapılan aktarma ve eklemeler sonucu toplam ödeneğimiz 44.930.000 TL olmuştur. Yıl içerisinde toplam ödeneğin %93,21'lik kısmına tekabül eden 41.880.803,92 TL tutarında harcama gerçekleşmiştir

2019 YILI YATIRIM HARCAMALARININ BÜTÇE ÖDENEK DAĞILIMLARI				
	Başlangıç Ödeneği	Revizeli Ödeneği	Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı %
06. Sermaye Giderleri	20.500.000,00	44.930.000,00	41.880.803,92	93,21
06.01 Mamul Mal Alımı	2.700.000,00	3.020.000,00	2.932.706,42	97,11
06.03 Gayri Maddi Alımları	250.000,00	350.000,00	328.350,91	93,81
06.04 Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırma	-	40.000	-	-
06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	16.500.000,00	40.220.000,00	37.374.571,61	92,93
06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	50.000,00	50.000,00	49.807,80	99,62
06.07 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri	1.000.000,00	1.250.000,00	1.195.367,18	95,63

2.6.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

İş planlarımız doğrultusunda hazırlanarak Üniversitemizce teklif edilen ancak kendi nakit imkanları doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca revize edilerek onaylanan Ayrıntılı Finans Programı (AFP) çerçevesinde ödemelerde sıkıntı yaşanmaktadır. Yine 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması ve itirazlar nedeniyle ihalelerin sonuçlanması gecikmektedir.

3. 2019 Yılı Proje Uygulamaları

3.1. Devam Eden Projeler

3.1.1. 2009H031520 Nolu Kampüs Altyapı Projesi

63.700.000TL proje bedelli Kampüs Altyapısı Projesinin 2019 yılı başlangıç ödeneği 1.900.000 TL'dir. Yıl içerisinde Proje ödeneğinin 1.000.000 TL'lik tutarının derslik ve merkezi birimler alt projesi olan Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası projesine aktarılmıştır. Kalan 900.000 TL ödenekten toplam 615.611,67 TL harcama yapılmıştır. Yılı ödeneğinin %68,40 oranında harcama gerçekleşmiştir..

3.1.2. 2009H031530 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

110.738.000 TL proje bedelli Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin 2019 yılı başlangıç ödeneği 12.900.000 TL'dir. Proje; 47.200.000 TL bedelli Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası (20.800 m2), 16.038.000 TL bedelli TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ek) Binası (6.500 m2), 21.800.000 TL bedelli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası (8.000 m2) ve 25.700.000 TL bedelli Öğrenci İşleri Merkez Binası (7.800 m2) olmak üzere 4 alt projeden oluşmaktadır.

Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası Projesi

2018 yılı içerisinde ihalesi yapılan 20.800 m2 kapalı alana sahip “Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası” projesinin ihale bedeli (KDV dahil) 46.462.500 TL olup; Demir Çelik Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi yanındaki alanda yapımına başlanmış ve 2019 yılında 13.497.167,05 TL harcama yapılmış olup, kümülatif harcaması 24.817.631,05 TL’yi bulmuştur. Yatırım Bütçesindeki daralmadan dolayı projenin 2022 yılı sonuna doğru bitilmesi öngörüldüğünden idaremizce proje bitiş tarihinin 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.



Mühendislik Fakültesi Laboratuvar İnşaatı



Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Projesi

TOBB Teknik Bilimler Projesi

2017 yılı içerisinde ihalesi yapılan 6.500 m2 kapalı alana sahip “TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ek) Bina İnşaatı” projesinin ihale bedeli (KDV dahil) 12.150.460 TL’dir. 2018 yılı Kasım ayı içerisinde Karabük Organize Sanayi Bölgesindeki Üniversitemize tahsis edilen TOBB yerleşkimizdeki eğitim binamızın yanında ek bina olarak yapımına başlanmış olup 2019 yılında 4.757.523,34 TL harcama yapılmıştır. Bugüne kadar yapılan kümülatif harcama 11.338.262,34 TL’dir. Proje ödeneğinden Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin alt projelerinden Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası Projesine 3.000.000 TL, Öğrenci İşleri Merkezi Projesine ise 700.000 TL aktarılmıştır. İşin bitirilmesi için yüklenici firmaya İdaremizce 17.11.2019 tarihine kadar cezalı süre uzatımı verilmiş ancak, iş bitirilemediğinden 19.11.2019 tarihli Rektörlük Olur'u ile sözleşme feshedilmiştir.



TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Projesi

2017 yılı içerisinde ihalesi yapılan 12.000 m2 kapalı alana sahip ‘‘Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası Projesinin’’ ihale bedeli (KDV dahil) 16.520.000 TL olup; yapımına 2017 yılı Ekim ayı içerisinde Beşbınevler Yerleşkesinde başlanmıştır. Proje için 2017 yılında 1.265.527,72 TL, 2018 yılında 3.861.187,28 TL, 2019 yılında ise 757.522,09 TL kümülatif olarak ise toplamda 5.884.237,09 TL harcama yapılmıştır. Yüklenici firma işi tamamlayamamış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında firmanın tasviyesi için onay alınmış ve yıl sonuna kadar tasviye süreci tamamlanmıştır. Proje yılı ödeneğinden Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası Projesine 2.000.000 TL, Muhtelif İşler Projesine ise 170.000 TL aktarılmıştır.



Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaatı



Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Projesi

Öğrenci İşleri Merkezi Projesi

2018 yılı içerisinde ihalesi yapılan 7.800 m2 kapalı alana sahip ve maliyetinin tamamı Üniversitemiz likit değerlerinden karşılanacak olan “Öğrenci İşleri Merkez Binası” projesinin ihale bedeli (KDV dahil) 19.458.000 TL olup; 2018 yılı haziran ayı içerisinde Demir Çelik Yerleşkesinde yapımına başlanmış olup, 2018 yılında 5.597.879,74 TL, 2019 yılında ise 17.737.307,46 TL harcama yapılmıştır. Bugüne kadar yapılan kümülatif harcama 23.335.187,20 TL olarak gerçekleşmiş olup, işin 2020 yılı mart ayı sonuna kadar bitirilmesi öngörülmektedir.



Öğrenci İşleri Merkezi İnşaatı



Öğrenci İşleri Merkezi İnşaatı

3.1.3. 2014H050150 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

2019 yılı proje bedeli 27.300.000 TL olup yılı başlangıç ödeneği 1.500.000 TL'dir. Proje kapsamında halı sahalardan, tenis kortlarının ve içerisinde basketbol ve voleybol sahalardan da yer aldığı 1 adet spor kompleksi yapım işi ihalesi (KDV dahil) 17.500.000 TL bedelle 2018 yılı içerisinde tamamlanmış ve 2018 yılı içerisinde 5.861.503 TL harcama yapılmıştır. 2019 yılında proje kapsamında herhangi bir harcama yapılmamış olup, 1.500.000 TL tutarındaki yılı proje ödeneğinin tamamı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının uygun görüşü üzerine Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin bir alt projesi olan Öğrenci İşleri Merkezi Projesine aktarılmıştır.



Spor Tesisleri projesi

3.1.4. 2017H030025 Nolu Heyelan Önleme Projesi

2019 yılı proje bedeli 35.000.000 TL olan Üniversitemiz stadyum ve açık otopark altı zemin güçlendirme işinin ihaleleri yılsonuna doğru tamamlanmış olup, (KDV hariç) 1.149.000 TL ve 19.741.000 TL bedelli iki ayrı firma ile sözleşmeler imzalanmıştır. Ödeneğinin tamamı likit kaynaklarımızdan karşılanacak olan projeye 2018 yılı içerisinde 24.181.075 TL harcama yapılarak tamamlanan projeye, 2019 yılında da heyelan önlemeye yönelik yapımı planlanan yeni bir kazıklama yapım işi için iz ödenek konmuş ancak herhangi bir harcama yapılmamıştır.

(BİN)

Proje No	Projenin Adı	Karakteristik	Başlama Bitiş	Proje Tutarı	(A) 2019 Öncesi Toplam Harcama	2019 Kesintili Başlangıç Ödeneği	2019 Revize Toplamı	(B) 2019 Toplam Harcama	(A+B) Toplam Harcama	Proje Gerçekleşme Oranı
2009H031520	Kampüs Altyapı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2009-2021	63.700	58.000	1.900	900	616	58.616	81-90
2009H031530	Derslik ve Merkezi Birimler	Müh.Fak.Lab.Bin. (20.800 m ²), SBMYO (8.000m ²), Tobb Teknik Bilimler MYO (6.500 m ²), Öğrenci İşleri Mer. Binası (7.800 m ²)	2009-2022	110.738	28.626	12.900	39.120	36.750	65.376	51-60
2014H050150	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Açık Tenis Kortu (3 adet), Basketbol Sahası (3 adet), Spor Tesisi, Voleybol Sahası (3adet)	2014-2022	27.300	5.862	1.500	0	0	5.862	21-30
2017H030025	Heyelan Önleme Projesi	İnşaat Bakım Onarımı	2017-2020	35.000	24.181	100	100	0	24.181	91-100
TOPLAM				236.738	116.669	16.400	40.120	37.366	154.035	

3.2. Tamamlanan Projeler

3.2.1. 2019H033020 Nolu Yayın Alımı Projesi

2019 yılı proje bedeli ve başlangıç ödeneği 500.000 TL'dir. Toplam ödeneğin 442.761,36 TL'si, basılı yayın alımları ve yapımları, elektronik ortamda yayın alımları ve yapımları ile diğer yayın alımları ve yapımlarına harcanmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı %88,55 olarak gerçekleşmiştir.

3.2.2. 2019H036630 Nolu Muhtelif İşler Projesi

2019 yılı proje bedeli ve başlangıç ödeneği 3.500.000 TL'dir. Yeni hizmete alınan eğitim binaları ve mevcut hizmet binalarında yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasından dolayı ek ödenek ihtiyacı hasıl olmuş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından uygun görüş alınarak likit değerlerimizden 500.000 TL ödenek ilave edilmiştir. Yine Diş Hekimliği Fakültesine kurulacak Fantom laboratuvarı için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının uygun görüşü ile Döner Sermaye Kaynaklarından Karşılanmak üzere proje bedeli 7.500.000 TL artırılmış, son olarak Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Projesinden 170.000 TL aktarılmak suretiyle projenin toplam bedeli 11.670.000,00 TL olarak revize edilmiştir. Muhtelif İşler Projesinin 6.305.982,54 TL tutarı Fantom Laboratuvarı kurulması için Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından ödenmiş olup, 2019 yılında toplamda 10.369.453,49 TL harcama yapılmıştır.

3.2.3. 2019H033100 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Projenin 2019 yılı toplam ödeneği 100.000 TL'dir. Bazı projelerin çizimi ve revizesi için 2019 yılında 9.440,00 TL tutarında harcama yapılmıştır.

(BİN)

Proje No	Projenin Adı	Karakteristik	Başlama Bitiş	Proje Tutarı	(A) 2019 Öncesi Toplam Harcama	2019 Kesintili Başlangıç Ödeneği	2019 Revize Toplamı	(B) 2019 Toplam Harcama	(A+B) Toplam Harcama	Proje Gerçekleşme Oranı
2019H033020	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2019-2019	500	0	500	500	443	443	%100
2019H036630	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Taşıt: T-12 (1 adet)	2019-2019	3.500	0	3.500	11.670	10.370	10.370	%100
2019H033100	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Etüt-Proje	2019-2019	100	0	100	100	9	9	%100
TOPLAM				4.100	0	4.100	12.270	10.822	10.822	%100

2019 YILI YATIRIM HARCAMALARI IV. DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı : Karabük Üniversitesi
Sektör : Eğitim

(BİN TL)

Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı Dış	Proje Tutarı Toplam	(A) 2019 Öncesi Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	2019 Yılı Başlangıç Ödeneği (KBÖ) (13)	(+) / (-) (14)	Aktarma Miktarı (15)	(B) 2019 Toplam Harcama (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	(A+B) Harcama Toplamı (18)
254325	491	2009H031520	Kampüs Altyapı	Özel Bütçe	2009-2021	Karabük	0	63.700	58.000	0	0	1.900	(-)	1.000	616	0	58.616
267354	491	2009H031530	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2009-2022	Karabük	0	110.738	28.626	0	0	12.900	(+)	26.220	36.750	0	65.376
270532	491	2014H050150	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2014-2022	Karabük	0	27.300	5.862	0	0	1.500	(-)	1.500	0	0	5.862
265170	491	2017H030025	Heyelan Önleme Projesi [87]	Özel Bütçe	2017-2020	Karabük	0	35.000	24.181	0	0	100			0	0	24.181
244513	491	2019H036630	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2019-2019	Karabük	0	11.670	0	0	0	3.500	(+)	8.209	10.370	0	10.370
244507	491	2019H033020	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2019-2019	Karabük	0	500	0	0	0	500	(+)		443	0	443
244501	491	2019H033100	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2019-2019	Karabük	0	100	0	0	0	100	(+)		9	0	9
TOPLAM							0,00	249.008	116.669	0	0	20.500	0	31.929	48.188	0	164.857

2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kuruluş Adı : Karabük Üniversitesi
Sektör : Eğitim
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Dönem : 4. Dönem (Aralık Sonu)

(BİNTL)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2018 Sonu Kümülatif Harcama			2019 Yılı Program Ödenek			2019Yılı Revize Ödenek			2019Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
EĞİTİM	7		249.008		0	116.669			20.500			52.390			48.188
DİĞER	-		-		0	-			-			-		-	-
TOPLAM	7		249.008		0	116.669			20.500			52.390			48.188
