



**KARABÜK ÜNİVERSİTESİ**

**2020 YILI  
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE  
DEĞERLENDİRME RAPORU**



*“Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan  
gençlerimizin eğitilmesidir.”*

## İÇİNDEKİLER

<b>1. YÖNETİCİ ÖZETİ .....</b>	<b>4</b>
<b>2. GENEL DEĞERLENDİRME.....</b>	<b>5</b>
2.1. VİZYON.....	5
2.2. MİSYON.....	5
2.3. TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER .....	6
2.4. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI .....	7
2.5. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ.....	7
2.6. 2019 YILI YATIRIM UYGULAMALARI .....	9
<b>3. 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI .....</b>	<b>9</b>
3.1. DEVAM EDEN PROJELER.....	10
3.2. TAMAMLANAN PROJELER .....	17

## 1. Yönetici Özeti



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizat ile donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi gereğince hazırlanan Üniversitemiz 2020 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

**Prof. Dr. Refik POLAT**  
**Rektör**



## 2. Genel Değerlendirme

### 2.1. Vizyon

Hayat boyu öğrenme kültürünü içselleştirmiş, bölgenin ve dünyanın gelişimine katkı sağlayan, nitelikli eğitim ve araştırma yapan, paydaş odaklı, tercih edilen, tanınırlığı yüksek bir üniversite olmaktır.

### 2.2. Misyon

Eğitim-öğretim, ar-ge ve topluma hizmet süreçlerinde paydaş odaklı; insani değerleri özümsemiş, sürekli öğrenen, girişimci bireyler yetiştirmektir.

## 2.3. Temel Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaç 1: Nitelikli eğitim vermek ve başarılı öğrencileri çekmek	
H.1.1	2020 yılına kadar 4 programın akreditesini sağlamak
H.1.2	Girişimci öğrenciler yetiştirmek
H.1.3	Web tabanlı eğitim teknolojilerini örgün eğitimi destekleyen bir unsur olarak yaygınlaştırmak
H.1.4	Akademik personel/öğrenci sayısını Türkiye ortalamasına yaklaştırmak
H.1.5	Akademik programların ve ders içeriklerinin ihtiyaçlar dikkate alınarak belli periyotlarla güncellenmesini sağlamak
H.1.6	Eğitim-öğretim için gerekli fiziki alanları ve araçları geliştirmek
H.1.7	Yabancı dilde eğitim verilen program ve derslerin sayısını ve niteliğini artırmak
Stratejik Amaç 2: Ar-ge altyapı ve süreçlerini iyileştirmek	
H.2.1	Nitelikli yayın sayısını artırmak
H.2.2	Ar-ge altyapı ve potansiyelini güçlendirmek
H.2.3	Proje finansman ve fonlarının etkin kullanımı
Stratejik Amaç 3: Öğrenci, çalışan ve diğer paydaşlara yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, mesleki faaliyet ve süreçleri geliştirmek	
H.3.1	Sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve mesleki faaliyetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak
H.3.2	Sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve mesleki faaliyetler memnuniyet oranlarını artırmak
H.3.3	Sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve mesleki faaliyetler için gerekli altyapıyı geliştirmek ve aktif kullanımını sağlamak
Stratejik Amaç 4: Ulusal ve uluslararası tanınırlığımızı artırmak	
H.4.1	Sivil toplum ve sektörle ilişkileri geliştirmek
H.4.2	Üniversite iletişim ve tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi
H.4.3	Uluslararası öğrencilerle iletişimi güçlendirmek
H.4.4	Dış paydaşlarla protokole dayalı ve AB projeleri kapsamında ilişkilerin geliştirilmesi
Stratejik Amaç 5: İdari ve yönetim süreçlerini iyileştirmek	
H.5.1	Hizmet içi eğitim olanaklarının geliştirilmesi ve görevde yükselme imkanlarının sağlanması
H.5.2	Üniversitemizde süreç yönetimini etkinleştirerek yetki ve sorumlulukları belirlemek
H.5.3	Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını kurumsallaştırmak
H.5.4	Personel motivasyonunu artırmak

## 2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi özel bütçeli bir kamu kuruluşu olup, 2020 yılı yatırım programında yer alan proje giderleri büyük oranda hazine yardımı ile, makine-teçhizat alımı ve büyük onarım giderlerinin bir kısmı ise yılın son çeyreğinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının uygun görüşü alınarak yaz okulu gelirlerimizden finanse edilmiştir.

## 2.5. Mevcut Üretim Kapasitesi

Üniversitemiz, 29 Mayıs 2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5662 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kurulmuştur.

Üniversitemizde 16 fakülte, 3 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar, 2 enstitü, 15 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır. Üniversitemizde 47.442 öğrenci eğitim görmekte, 44’ü yabancı uyruklu olmak üzere 1092 akademik, 469 idari personel ve 296 sürekli işçi görev yapmaktadır.

### 2.5.1. Taşınmazlarının Dağılımı

Hizmet Alanı (m <sup>2</sup> )	Demir Çelik Yerleşkesi	Safranbolu Yerleşkesi	Eskipazar Yerleşkesi	Yenice Yerleşkesi	Eflani Yerleşkesi	TOBB Yerleşkesi	Ovacık	Diğer Taşınmazlar	Toplam (m <sup>2</sup> )
Eğitim	115.035	23.020,69	15.150	3.289	2.950	5.892	4.424	882	170.642,69
Barınma	–	1.300	1.470	–	800	–	–	7.625	11.195
Beslenme	6.480	1.345	390	320	115	–	–	–	8.650
Kültür	1.730	1.450	–	–	–	–	–	–	3.180
Spor	13.869	–	2.494	–	–	–	–	–	16.363
Laboratuvar	9.010,78	1.188,31	232,08	-	195	-	-	-	10.626,17
Diğer (İdari,Tesis, Depo,)	14.886,20	–	2.205	815	–	–	–	475	18.381,20
Açık Alan	693.351,50	21.395,92	95.760	7.396,34	101.075,97	46.662,79	4.963	19.083,01	989.688,53
Kapalı Alan	161.010,98	28.304	21.941,08	4.424	4.060	5.892	4.424	8.982	239.038,06

Kaynak: 2020 Yılı Faaliyet Raporu


(\*) 5.700 m<sup>2</sup> açık alan Teknokent AŞ tahsis edilmiştir

(\*\*) Safranbolu Yerleşkesinde yer alan ve geçici olarak Safranbolu Turizm Fakültesine tahsis edilmiş olan 80 ada 172 parsel 2.000 m<sup>2</sup> alan üzerine kurulu 848 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip tarihi taş bina, Milli Emlak Müdürlüğünce Sağlık Bakanlığından alınarak 29.01.2003 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesine süresiz tahsis edilmiş olup, 2007 yılında Üniversitemizin kurulmasıyla Karabük Üniversitesine devredilmiştir. (839/5 parsel Kaymakamlığa tahsis edilmiştir.)


(\*\*) Eskipazar Meslek Yüksekokulu Yerleşkesini oluşturan YİBO (Yatılı İlköğretim Bölge Okulu) binası 20.01.2009 tarihinde, Eskipazar Anadolu Lisesi binası da, 11.08.2009 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üniversitemize geçici olarak tahsis edilmiştir.

(\*\*) Eflani Meslek Yüksekokulu Yerleşkesini oluşturan 101 ada 5 parselde kayıtlı 101.000 m<sup>2</sup> alan üzerine kurulu YİBO (Yatılı İlköğretim Bölge Okulu) binası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üniversitemize süresiz tahsis edilmiştir.

(\*\*) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 5.892,00 m<sup>2</sup> alan üzerine kurulu, 2.100 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip (arsa Karorsan tarafından tahsis edilmiş) hizmet binası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Üniversitemize tahsis edilmiştir.

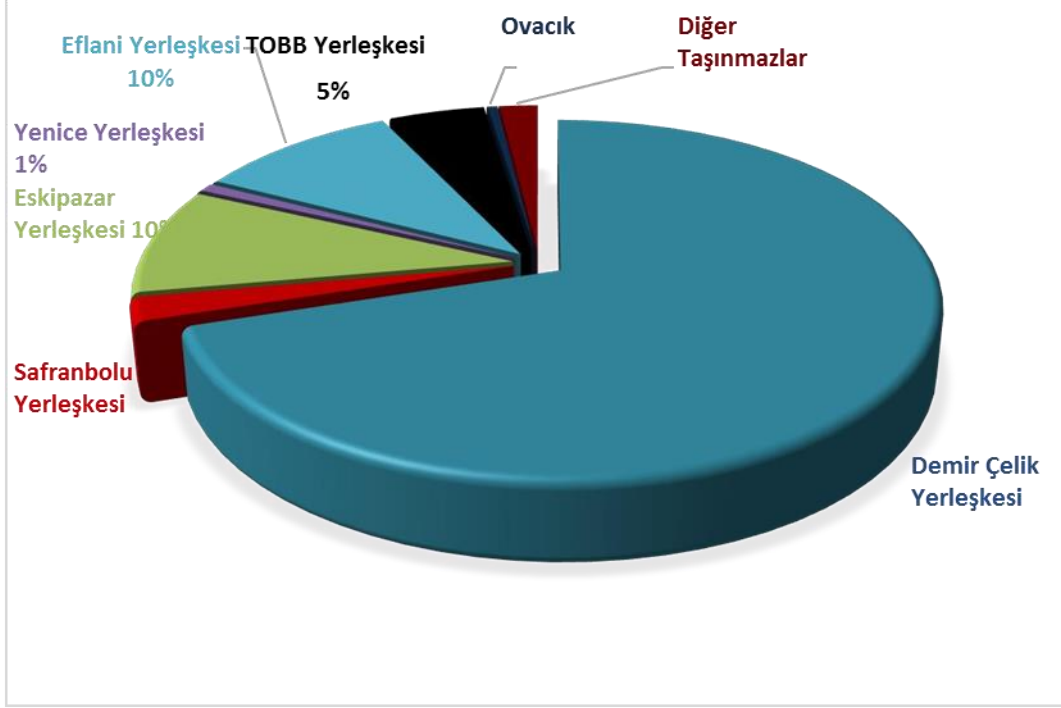

## 2.5.2 Kapalı Alanların Dağılımı

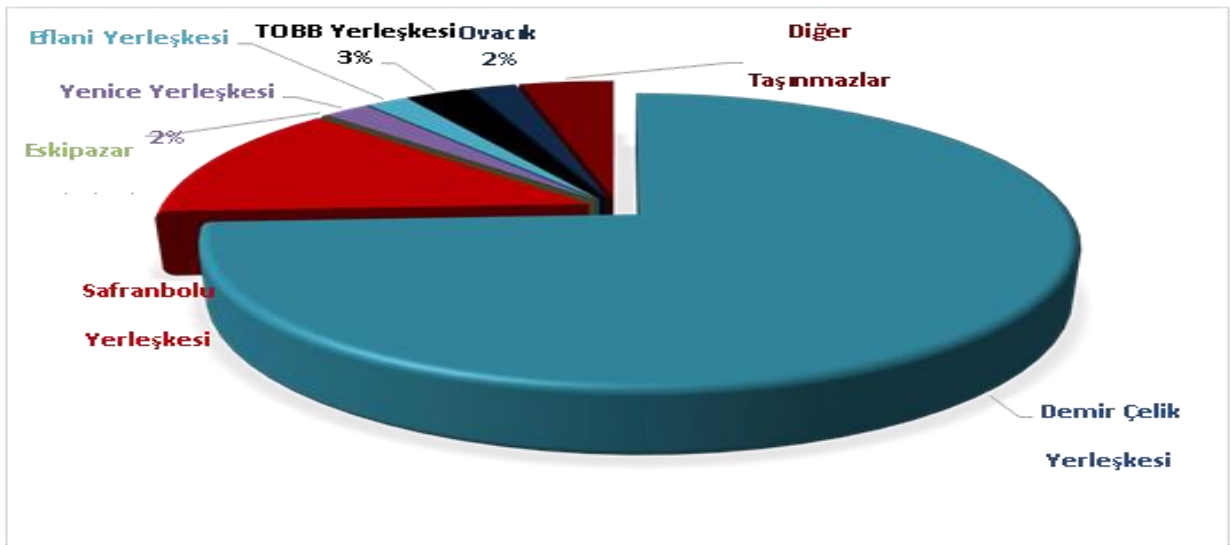



## 2.6. 2020 Yılı Yatırım Uygulamaları

### 2.6.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemiz 2020 Yatırım Programında 7 proje yer almakta olup, 19.002.000,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Başlangıç ödeneğine yapılan aktarma ve eklemeler sonucu toplam ödeneğimiz 34.640.000,00 TL olmuştur. Yıl içerisinde toplam ödeneğin %87,44'lük kısmına tekabül eden 30.429.494,77 TL tutarında harcama gerçekleşmiştir.

Times	Başlangıç Ödeneği	Revizeli Ödeneği	Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı %
<b>06. Sermaye Giderleri</b>	<b>19.002.000,00</b>	<b>34.640.000,00</b>	<b>30.429.494,77</b>	<b>87,44</b>
<b>06.01 Mamul Mal Alımı</b>	4.500.000,00	6.315.000,00	6.015.832,71	95,26
<b>06.03 Gayri Maddi Alımları</b>	500.000,00	550.000,00	423.003,70	76,91
<b>06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri</b>	11.902.000,00	22.775.000,00	22.128.915,35	97,16
<b>06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri</b>	100.000,00	100.000,00	97.910,46	97,91
<b>06.07 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri</b>	2.000.000,00	4.900.000,00	1.763.832,61	36,00

*Kaynak: E-Bütçe sisteminden alınmıştır.*

### 2.6.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

İş planlarımız doğrultusunda hazırlanarak Üniversitemizce teklif edilen ancak kendi nakit imkanları doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca revize edilerek onaylanan Ayrıntılı Finans Programı (AFP) çerçevesinde ödemelerde sıkıntı yaşanmaktadır. Yine 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması ve itirazlar nedeniyle ihalelerin sonuçlanması gecikmektedir.

## 3. 2020 Yılı Proje Uygulamaları

### **3.1. Devam Eden Projeler**

#### **3.1.1. 2020H03-151448 Nolu Kampüs Altyapı Projesi**

5.800.000 TL proje bedelli Kampüs Altyapısı Projesinin 2020 yılı başlangıç ödeneđi 1.000.000 TL'dir. Yıl içerisinde Proje ödeneđinin 250.000 TL'lik tutarının derslik ve merkezi birimler alt projesi olan TOBB Teknik Bilimler MYO projesine aktarılmıřtır. Kalan 750.000 TL ödenekten toplam 728.139,04 TL harcama yapılmıřtır. Yılı ödeneđinin %97 oranında harcama gerekleřmiřtir.

#### **3.1.2. 2009H031530 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi**

102.555.000 TL proje bedelli Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin 2020 yılı başlangıç ödeneđi 7.500.000 TL'dir. Proje; 60.500.000 TL bedelli Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası (20.800 m<sup>2</sup>), 18.926.000 TL bedelli TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ek) Binası (6.500 m<sup>2</sup>), 23.129.000 TL bedelli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası (8.000 m<sup>2</sup>) olmak üzere 3 alt projeden oluřmaktadır.

#### **Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası**

2018 yılı içerisinde ihalesi yapılan 20.800 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip "Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası" projesinin ihale bedeli (KDV dahil) 46.462.500 TL olup; Demir elik Yerleřkesi Mühendislik Fakültesi yanındaki alanda yapımına başlanmıř ve 2020 yılında 12.623.254,06 TL harcama yapılmıř olup, kümülatif harcaması 34.099.254,06 TL'yi bulmuřtur. Yatırım Bütesindeki daralmadan dolayı projenin 2022 yılı sonuna dođru bitilmesi öngörüldüđünden idareimizce proje bitiř tarihinin 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiřtir.



Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası İnşaatı



Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası Projesi

## **TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ek Bina İnşaatı**

2017 yılı içerisinde ihalesi yapılan 6.500 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip “TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ek) Bina İnşaatı” projesinin ihale bedeli (KDV dahil) 12.150.460 TL’dir. 2018 yılı Kasım ayı içerisinde Karabük Organize Sanayi Bölgesindeki Üniversitemize tahsis edilen TOBB yerleşkemizdeki eğitim binamızın yanında ek bina olarak yapımına başlanmış olup 2020 yılında 7.211.548,36 TL harcama yapılmıştır. Bugüne kadar yapılan kümülatif harcama 18.549.548,36 TL’dir.



TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ek Bina

## Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

2017 yılı içerisinde ihalesi yapılan 12.000 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip “Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası Projesinin” ihale bedeli (KDV dahil) 16.520.000 TL olup; yapımına 2017 yılı Ekim ayı içerisinde Beşbinevler Yerleşkesinde başlanmıştır. Proje için 2017 yılında 1.265.527,72 TL, 2018 yılında 3.861.187,28 TL, 2019 yılında ise 757.522,09 TL kümülatif olarak ise toplamda 5.884.237,09 TL harcama yapılmıştır. Yüklenici firma işi tamamlayamamış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında firmanın tasviyesi için onay alınmış ve yıl sonuna kadar tasviye süreci tamamlanmış olup inşaat halindeyken Sağlık Bakanlığı talebi üzerine bakanlığa devredilmiştir. Yılı ödeneği olan 302.000 TL TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İkmal İnşaatı yapım işine aktarılmıştır.



Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaatı



Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Projesi

## Öğrenci İşleri Merkezi Projesi

2018 yılı içerisinde ihalesi yapılan 7.800 m2 kapalı alana sahip ve maliyetinin tamamı Üniversitemiz likit değerlerinden karşılanacak olan “Öğrenci İşleri Merkez Binası” projesinin ihale bedeli (KDV dahil) 19.458.000 TL olup; 2018 yılı haziran ayı içerisinde Demir Çelik Yerleşkesinde yapımına başlanmış olup, 2018 yılında 5.597.879,74 TL, 2019 yılında ise 17.737.307,46 TL harcama yapılmıştır. Bugüne kadar yapılan kümülatif harcama 23.335.187,20 TL olarak gerçekleşmiştir. Yeni ve modern bir bina olarak inşa edilen Öğrenci İşleri Merkezi 2020 yılının Mart ayında faaliyete geçti.



Öğrenci İşleri Merkezi

### 3.1.3. 2014H050150 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

2019 yılı proje bedeli 27.300.000 TL olup yılı başlangıç ödeneği 1.500.000 TL'dir. Proje kapsamında halı sahaların, tenis kortlarının ve içerisinde basketbol ve voleybol sahalarının da yer aldığı 1 adet spor kompleksi yapım işi ihalesi (KDV dahil) 17.500.000 TL bedelle 2018 yılı içerisinde tamamlanmış ve 2018 yılı içerisinde 5.861.503 TL harcama yapılmıştır. 2020 yılı proje bedeli 22.715.000 TL olup yılı başlangıç ödeneği 2.000 TL'dir. 2020 yılında proje kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır.



Spor Tesisleri Projesi

#### **3.1.4. 2017H030025 Nolu Heyelan Önleme Projesi**

2020 yılı proje bedeli 32.539.000 TL'dir. Tüm merkez kampüs için yaptırılan Geoteknik Zemin Etüdü Raporu sonucuna göre heyelan riski görülmemiş olup, Proje kapsamında yeni bir ihaleye çıkılmamasına ve projenin yatırım programından çıkarılarak ödeneğin Muhtelif İşler Projesine bina güçlendirme işi için aktarılması Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına talep edilmiştir. 2020 yılında da heyelan önlemeye yönelik yapımı planlanan yeni bir kazıklama yapım işi için iz ödenek konmuş ancak herhangi bir harcama yapılmamıştır.

(BİN)

Proje No	Projenin Adı	Karakteristik	Başlama Bitiş	Proje Tutarı	(A) 2020 Öncesi Toplam Harcama	2020 Kesintili Başlangıç Ödeneği	2020 Revize Toplamı	(B) 2020 Toplam Harcama	(A+B) Toplam Harcama	Proje Gerçekleşme Oranı
2009H031520	Kampüs Altyapı	Doğalgaz Dönüşümü, Peyzaj	2009-2021	5.800	0	1.000	750	728	728	81-90
2009H031530	Derslik ve Merkezi Birimler	Müh. Fak. Lab. Bin. (20.800 m <sup>2</sup> ), SBMYO (8.000m <sup>2</sup> ), TOBB Teknik Bilimler MYO (6.500 m <sup>2</sup> )	2009-2022	102.555	38.320	7.500	20.350	19.834	58.154	51-60
2014H050150	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Açık Tenis Kortu (3 adet), Basketbol Sahası (3 adet), Spor Tesisi, Voleybol Sahası (3adet)	2014-2022	22.715	5.862	2	0	0	5.862	21-30
2017H030025	Heyelan Önleme Projesi	İnşaat Bakım Onarımı	2017-2020	32.539	24.281	3.000	100	0	24.281	91-100
<b>TOPLAM</b>				<b>163.609</b>	<b>68.463</b>	<b>11.502</b>	<b>21.200</b>	<b>20.562</b>	<b>89.025</b>	

Devam Eden Projeler Tablosu



## **3.2. Tamamlanan Projeler**

### **3.2.1. 2019H033020 Nolu Yayın Alımı Projesi**

2020 yılı proje bedeli ve başlangıç ödeneđi 1.000.000 TL'dir. Toplam ödeneđin 758.910 TL'si, basılı yayın alımları ve yapımları, elektronik ortamda yayın alımları ve yapımları ile diđer yayın alımları ve yapımlarına harcanmıřtır. Harcamanın ödeneđe oranı %76 olarak gerekleřmiřtir.

### **3.2.2. 2019H036630 Nolu Muhtelif İşler Projesi**

2020 yılı proje bedeli ve başlangıç ödeneđi 6.100.000,00 TL'dir. Yeni hizmete alınan eđitim binaları ve mevcut hizmet binalarında yeni ihtiyaların ortaya ıkmasından dolayı ek ödenek ihtiyacı hasıl olmuř, Cumhurbaşkanlıđı Strateji ve Büte Başkanlıđından uygun görüř alınarak likit deđerlerimizden 6.315.000 TL ödenek ilave edilmiřtir. 2020 yılında toplamda 9.044.277 TL harcama yapılmıřtır.

### **3.2.3. 2019H033100 Nolu eřitli Ünitelerin Etüt Projesi**

Projenin 2020 yılı toplam ödeneđi 70.000 TL'dir. Bazı projelerin izimi ve revizesi iin 2020 yılında 63.366,00 TL tutarında harcama yapılmıřtır.

(BİN)

Proje No	Projenin Adı	Karakteristik	Başlama Bitiş	Proje Tutarı	(A) 2019 Öncesi Toplam Harcama	2019 Kesintili Başlangıç Ödeneği	2019 Revize Toplamı	(B) 2019 Toplam Harcama	(A+B) Toplam Harcama	Proje Gerçekleşme Oranı
2019H033020	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2020-2020	1.000	0	1.000	1.000	758	758	%100
2019H036630	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Taşıt: T-12 (1 adet)	2020-2020	6.100	0	6.100	12.415	9.044	9.044	%100
2019H033100	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Etüt-Proje	2020-2020	70	0	70	70	63	63	%100
<b>TOPLAM</b>				<b>7.170</b>	<b>0</b>	<b>7.170</b>	<b>13.485</b>	<b>9.865</b>	<b>9.865</b>	<b>%100</b>

Tamamlanan Projeler Tablosu

**2020 YILI YATIRIM HARCAMALARI IV. DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME RAPORU**

**Kuruluş Adı : Karabük Üniversitesi**  
**Sektör : Eğitim**

(BİN TL)

Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı Toplam	(A) 2020 Öncesi Kümülatif Harcama	2020 Ödenek Toplam	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği (KBÖ)	(+) / (-)	Ekleme Miktarı	(B) 2020 Toplam Harcama	(A+B) Harcama Toplamı
254325	491	2020H03-151448	Kampüs Altyapı*	2020-2022	Karabük	5.800.000,00	0,00	750.000,00	1.000,00	(+)	-250.000,00	728.139,04	728.139
267354	491	2009H03-1055	Derslik ve Merkezi Birimler	2009-2023	Karabük	102.555.000,00	38.320.000,00	20.350.000,00	7.500,00		12.850.000,00	19.834.802,42	58.154.802
270532	491	2014H05-2051	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2014-2023	Karabük	22.715.000,00	5.861.000,00	2.000,00	2,00		0,00	0,00	5.861.000,00
265170	491	2017H03-3260	Heyelan Önleme Projesi [87]	2017-2021	Karabük	32.539.000,00	24.281.000,00	100.000,00	100,00		-2.900.000,00	0,00	24.281.000,00
244513	491	2020H03-151443	Muhtelif İşler*	2020-2020	Karabük	12.368.000,00	0,00	12.368.000,00	6.100,00	(+)	6.315.000,00	9.044.277,07	9.044.277,07
244507	491	2020H03-151446	Yayın Alımı	2020-2020	Karabük	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000,00		0	758.910,24	758.910
244501	491	2020H03-151440	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2020-2020	Karabük	70.000,00	0,00	70.000,00	70,00		0,00	63.366,00	63.366,00
<b>TOPLAM</b>						<b>177.047.000,00</b>	<b>68.462.000,00</b>	<b>34.640.000,00</b>	<b>15.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.015.000,00</b>	<b>30.429.494,77</b>	<b>98.891.494,77</b>

## 2020 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

**Kuruluş Adı** : Karabük Üniversitesi  
**Sektör** : Eğitim  
**Bütçe Türü** : Özel Bütçe  
**Dönem** : 4. Dönem (Aralık Sonu)

(BİNTL)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2019 Sonu Kümülatif Harcama			2020 Yılı Program Ödenek			2020 Yılı Revize Ödenek			2020 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
EĞİTİM	7		177.047		0	68.462			15.772			34.640			98.891
DİĞER	-		-		0	-			-			-			-
<b>TOPLAM</b>	7		177.047		0	68.462			15.772			34.640			98.891
