



**KARABÜK ÜNİVERSİTESİ**

**2018 YILI  
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE  
DEĞERLENDİRME RAPORU**



*“Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan  
gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.”*

*K. Atatürk*

## İÇİNDEKİLER

<b>1. YÖNETİCİ ÖZETİ .....</b>	<b>4</b>
<b>2. GENEL DEĞERLENDİRME.....</b>	<b>5</b>
2.1. VİZYON .....	5
2.2. MİSYON .....	5
2.3. TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER .....	6
2.4. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI .....	6
2.5. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ .....	7
2.6. 2018 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....	9
<b>3. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI.....</b>	<b>10</b>
3.1. DEVAM EDEN PROJELER .....	10
3.2. TAMAMLANAN PROJELER.....	17

## 1. Yönetici Özeti



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizat ile donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi gereğince hazırlanan Üniversitemiz 2018 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

**Prof. Dr. Refik POLAT**  
**Rektör**



## 2. Genel Değerlendirme

### 2.1. Vizyon

Hayat boyu öğrenme kültürünü içselleştirmiş, bölgenin ve dünyanın gelişimine katkı sağlayan, nitelikli eğitim ve araştırma yapan, paydaş odaklı, tercih edilen, tanınırlığı yüksek bir üniversite olmaktır.

### 2.2. Misyon

Eğitim-öğretim, ar-ge ve topluma hizmet süreçlerinde paydaş odaklı; insani değerleri özümsemiş, sürekli öğrenen, girişimci bireyler yetiştirmektir.

## 2.3. Temel Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaç 1: Nitelikli eğitim vermek ve başarılı öğrencileri çekmek	
H.1.1	2020 yılına kadar 4 programın akreditesini sağlamak
H.1.2	Girişimci öğrenciler yetiştirmek
H.1.3	Web tabanlı eğitim teknolojilerini örgün eğitimi destekleyen bir unsur olarak yaygınlaştırmak
H.1.4	Akademik personel/öğrenci sayısını Türkiye ortalamasına yaklaştırmak
H.1.5	Akademik programların ve ders içeriklerinin ihtiyaçlar dikkate alınarak belli periyotlarla güncellenmesini sağlamak
H.1.6	Eğitim-öğretim için gerekli fiziki alanları ve araçları geliştirmek
H.1.7	Yabancı dilde eğitim verilen program ve derslerin sayısını ve niteliğini artırmak
Stratejik Amaç 2: Ar-ge altyapı ve süreçlerini iyileştirmek	
H.2.1	Nitelikli yayın sayısını artırmak
H.2.2	Ar-ge altyapı ve potansiyelini güçlendirmek
H.2.3	Proje finansman ve fonlarının etkin kullanımı
Stratejik Amaç 3: Öğrenci, çalışan ve diğer paydaşlara yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, mesleki faaliyet ve süreçleri geliştirmek	
H.3.1	Sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve mesleki faaliyetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak
H.3.2	Sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve mesleki faaliyetler memnuniyet oranlarını artırmak
H.3.3	Sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve mesleki faaliyetler için gerekli altyapıyı geliştirmek ve aktif kullanımını sağlamak
Stratejik Amaç 4: Ulusal ve uluslararası tanınırlığımızı artırmak	
H.4.1	Sivil toplum ve sektörle ilişkileri geliştirmek
H.4.2	Üniversite iletişim ve tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi
H.4.3	Uluslararası öğrencilerle iletişimi güçlendirmek
H.4.4	Dış paydaşlarla protokole dayalı ve AB projeleri kapsamında ilişkilerin geliştirilmesi
Stratejik Amaç 5: İdari ve yönetim süreçlerini iyileştirmek	
H.5.1	Hizmet içi eğitim olanaklarının geliştirilmesi ve görevde yükselme imkanlarının sağlanması
H.5.2	Üniversitemizde süreç yönetimini etkinleştirerek yetki ve sorumlulukları belirlemek
H.5.3	Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını kurumsallaştırmak
H.5.4	Personel motivasyonunu artırmak

## 2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi özel bütçeli bir kamu kuruluşu olup, yatırımlarının finansman kaynağı hazine yardımıdır.

## 2.5. Mevcut Üretim Kapasitesi

Üniversitemiz, 29 Mayıs 2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5662 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kurulmuştur.

Üniversitemizde 16 fakülte, 3 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar, 4 enstitü, 15 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır. Üniversitemizde 52.785 öğrenci eğitim görmekte, 956 akademik, 456 idari personel ve 262 sürekli işçi görev yapmaktadır.

### 2.5.1. Taşınmazlarının Dağılımı

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m2)			Toplam (m2)	Açıklama
	Üniversite	Maliye / Hazine	Diğer		
Demir-Çelik Yerleşkesi (Merkez Kampüsü)	615.617,94	83.040,40	-	698.658,34	-
Safranbolu Yerleşkesi	4.361,79	12.731,53	2.320,00	19.413,32	1
Eskipazar Yerleşkesi	-	-	95.760	95.760	2
Yenice Yerleşkesi	7.396,34	-	-	7.396,34	-
Eflani Yerleşkesi	-	-	101.075,97	101.075,97	3
TOBB Yerleşkesi	-	-	46.660,87	46.660,87	4
Personel Lojmanları	11.376,00	-	-	11.376,00	-
5000 Evler Yerleşkesi	-	5.278,00	-	5.278,00	-
Diğer Taşınmazlar	8.240,75	8.020,46	-	16.261,21	-
<b>Toplam</b>	<b>646.992,82</b>	<b>109.070,39</b>	<b>245.816,84</b>	<b>1.001.880,05</b>	<b>-</b>


Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

(1) Safranbolu Yerleşkesinde yer alan ve geçici olarak Safranbolu Turizm Fakültesine tahsis edilmiş olan 80 ada 172 parsel 2.000 m2 alan üzerine kurulu 848 m2 kapalı alana sahip tarihi taş bina, Milli Emlak Müdürlüğünce Sağlık Bakanlığından alınarak 29.01.2003 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesine süresiz tahsis e dilmiş olup, 2007 yılında Üniversitemizin kurulmasıyla Karabük Üniversitesine devredilmiştir.

(2) Eskipazar Meslek Yüksekokulu Yerleşkesini oluşturan YİBO (Yatılı İlköğretim Bölge Okulu) binası 20.01.2009 tarihinde, Eskipazar Anadolu Lisesi binası da, 11.08.2009 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üniversitemize geçici olarak tahsis edilmiştir.

(3) Eflani Meslek Yüksekokulu Yerleşkesini oluşturan 101 ada 5 parselde kayıtlı 101.000 m2 alan üzerine kurulu YİBO (Yatılı İlköğretim Bölge Okulu) binası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üniversitemize süresiz tahsis edilmiştir.

(4) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 5.892,00 m2 alan üzerine kurulu, 2.100 m2 kapalı alana sahip hizmet binası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Üniversitemize tahsis edilmiştir.

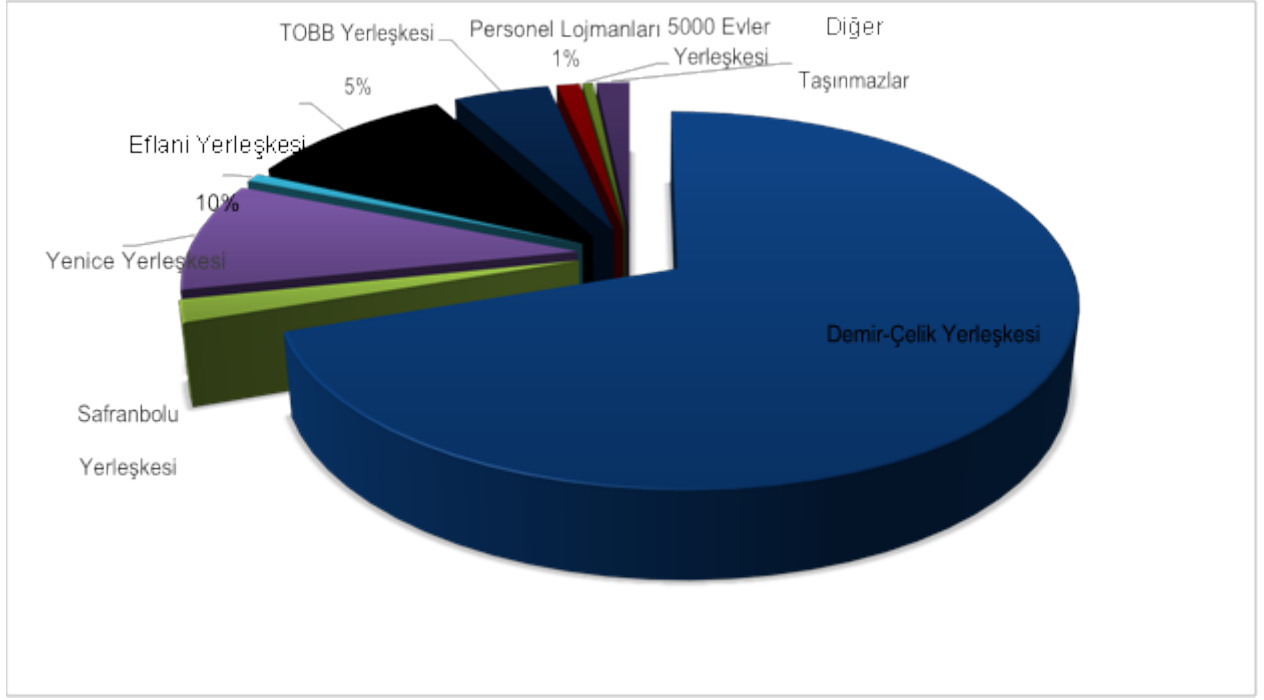


### 2.5.2 Kapalı Alanların Dağılımı

Üniversitemiz kapalı alanları toplamı 220.184 m<sup>2</sup>'dir. Toplam kapalı alanın %70'ini 151.148 m<sup>2</sup>'lik alan ile Demir Çelik Yerleşkesi (Karabük Merkez Kampüsü) oluşturmaktadır.

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m <sup>2</sup> )			Toplam (m <sup>2</sup> )	Açıklama
	Üniversite	Maliye / Hazine	Diğer		
Demir-Çelik Yerleşkesi (Merkez Kampüsü)	151.148			151.148	
Safranbolu Yerleşkeleri	27.595	1.128		28.723	
Eskipazar Yerleşkesi		16.410		16.410	Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Tahsisli
Yenice Yerleşkesi	4.424			4.424	
Eflani Yerleşkesi	-	2.950		2.950	Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Tahsisli
TOBB Yerleşkesi			2.100	2.100	TOBB Tarafından Tahsisli
Diğer	10.005			10.005	
<b>Toplam</b>	<b>193.172</b>	<b>20.488</b>	<b>2.100</b>	<b>215.760</b>	



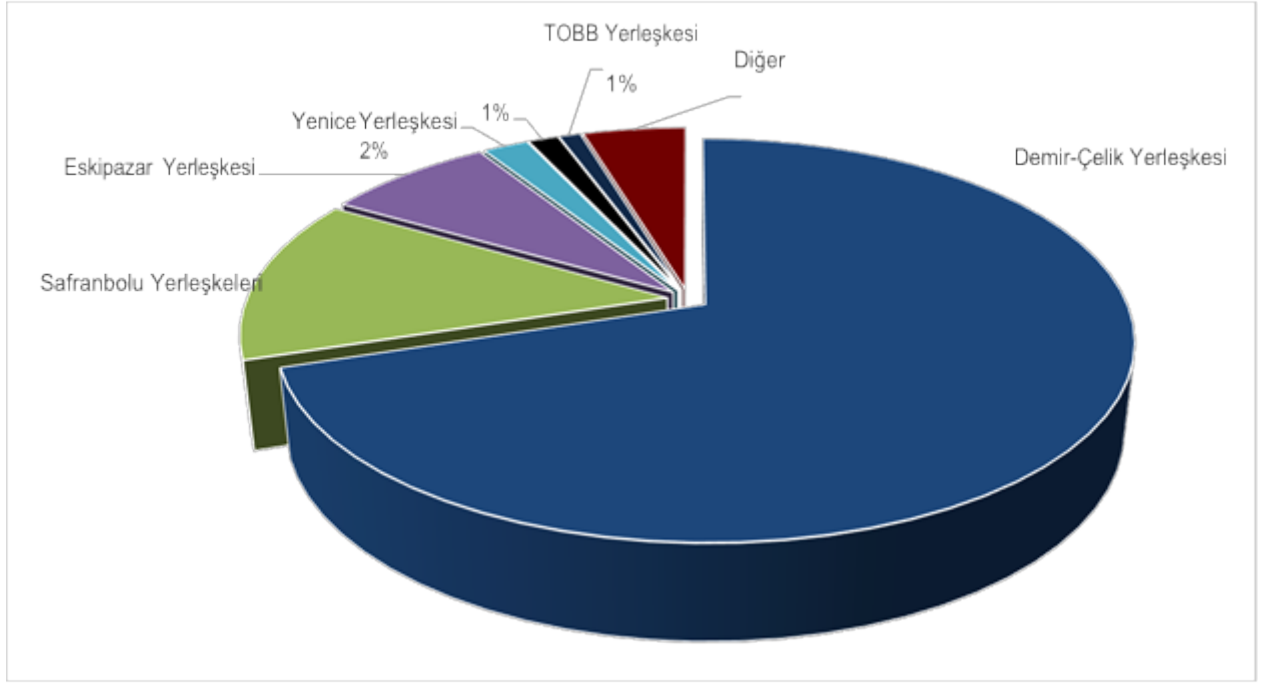

## 2.6. 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları

### 2.6.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemiz 2018 Yatırım Programında 7 proje yer almakta olup, 37.998.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Başlangıç ödeneğine yapılan aktarma ve eklemeler sonucu toplam ödeneğimiz 106.853.100 TL olmuştur. Yıl içerisinde toplam ödeneğin %98,38'lik kısmına tekabül eden 105.120.477 TL tutarında harcama gerçekleşmiştir.

2018 YILI YATIRIM HARCAMALARININ BÜTÇE ÖDENEK DAĞILIMLARI				
	Başlangıç Ödeneği	Revizeli Ödeneği	Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı %
<b>06. Sermaye Giderleri</b>	<b>37.998.000</b>	<b>106.853.100</b>	<b>105.120.477</b>	<b>98,38</b>
06.01 Mamul Mal Alımı	4.460.000	21.440.100	21.128.031	98,55
06.03 Gayri Maddi Alımları	490.000	2.772.000	2.573.660	92,85
06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	28.998.000	66.735.000	65.626.529	98,34
06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	50.000	270.000	269.179	99,7
06.07 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri	4.000.000	15.636.000	15.523.078	99,28

## 2.6.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

İş planlarımız doğrultusunda hazırlanarak Üniversitemizde teklif edilen ancak kendi nakit imkanları doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca revize edilerek onaylanan Ayrıntılı Finans Programı (AFP) çerçevesinde ödemelerde sıkıntı yaşanmaktadır. Yine 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması ve itirazlar nedeniyle ihalelerin sonuçlanması gecikmektedir.

## 3. 2018 Yılı Proje Uygulamaları

### 3.1. Devam Eden Projeler

#### 3.1.1. 2009H031520 Nolu Kampüs Altyapı Projesi

60.429.000 TL proje bedelli Kampüs Altyapısı Projesinin 2018 yılı başlangıç ödeneği 6.000.000 TL'dir. Yıl içerisinde likit değerlerimizden 854.000 TL ödenek ilave edilerek projenin yılı ödeneği 6.854.000 TL olarak revize edilmiştir.

Proje kapsamında Rektörlük Binası yanına 2.657 m2 kapalı ve 2.390 m2 açık alana sahip (KDV dahil) 2.724.620 TL ihale bedelli "Kapalı ve Açık Otopark" yapım işi için 2.425.265 TL harcanarak 2018 yılı Temmuz ayı içerisinde faaliyete geçmiştir.



Rektörlük Açık ve Kapalı Otopark Projesi

Kendi elektriğini üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla merkezi kampüs alanımızdaki 5 hizmet binası çatısına ve yan yüzlerine (KDV dahil) 6.711.511 TL ihale bedelli “1000 kWe Fotovoltaik Güç Santrali Kurulumu” yapım işine 2018 yılı içerisinde başlanmış, yıl içerisinde 5.800.343 TL harcama yapılmış olup, 2019 yılında bitirilerek faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.

Yine aynı Proje kapsamında (KDV dahil) 232.080 TL ihale bedelli “Ek kanalizasyon yapım işi” için yıl içerisinde 187.826 TL harcama yapılarak haziran ayında iş tamamlanmıştır.



Fotovoltaik Güç Santrali

### 3.1.2. 2009H031530 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

107.500.000 TL proje bedelli Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin 2018 yılı başlangıç ödeneği 16.798.000 TL'dir. Proje; 53.100.000 TL bedelli Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası (20.800 m<sup>2</sup>), 17.000.000 TL bedelli TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ek) Binası (6.500 m<sup>2</sup>), 23.000.000 TL bedelli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası (8.000 m<sup>2</sup>) ve 14.400.000 TL bedelli Öğrenci İşleri Merkez Binası (7.800 m<sup>2</sup>) olmak üzere 4 alt projeden oluşmaktadır.

2018 yılı içerisinde ihalesi yapılan 20.800 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip "Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası" projesinin ihale bedeli (KDV dahil) 46.462.500 TL olup; Temmuz ayı içerisinde Demir Çelik Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi yanındaki alanda yapımına başlanmış ve yıl sonuna kadar toplamda 11.321.646 TL harcama yapılmıştır. Laboratuvar Binasının 2020 yılında bitirilerek faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.



Mühendislik Fakültesi Laboratuvar İnşaatı



Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Projesi

2017 yılı içerisinde ihalesi yapılan 6.500 m2 kapalı alana sahip “TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ek) Binası” projesinin ihale bedeli (KDV dahil) 12.150.460 TL olup; Kasım ayı içerisinde Karabük Organize Sanayi Bölgesindeki TOBB yerleşimizdeki eğitim binamızın yanında ek bina olarak yapımına başlanmış ve yıl sonuna kadar toplamda 6.580.739 TL harcama yapılmıştır. Binanın 2019 yılında bitirilerek faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.



### TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

2017 yılı içerisinde ihalesi yapılan 12.000 m2 kapalı alana sahip “Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası” projesinin ihale bedeli (KDV dahil) 16.520.000 TL olup; Ekim ayı içerisinde Beşbinevler Yerleşkesinde yapımına başlanmış ve yıl sonuna kadar toplamda 4.748.523 TL harcama yapılmıştır. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Binasının 2019 yılında bitirilerek faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.



### Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaatı



### Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Projesi

2018 yılı içerisinde ihalesi yapılan 7.800 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip ve maliyetinin tamamı Üniversitemiz likit değerlerinden karşılanacak olan “Öğrenci İşleri Merkez Binası” projesinin ihale bedeli (KDV dahil) 19.458.000 TL olup; Haziran ayı içerisinde Demir Çelik Yerleşkesinde yapımına başlanmış ve yıl sonuna kadar toplamda 5.597.880 TL harcama yapılmıştır. Öğrenci İşleri Merkez Binasının 2019 yılında bitirilerek faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.



### Öğrenci İşleri Merkezi İnşaatı

### 3.1.3. 2014H050150 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

2018 yılı proje bedeli 23.000.000 TL olup yılı başlangıç ödeneği 6.000.000 TL'dir. Proje kapsamında halı sahalarn, tenis kortlarının ve içerisinde basketbol ve voleybol sahalarnın da yer aldığı 1 adet spor kompleksi yapımı işi ihalesi (KDV dahil) 17.500.000 TL bedelle 2018 yılı içerisinde tamamlanmış ve yıl içerisinde 5.861.503 TL harcama yapılmıştır. Projenin 2019 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir.



Spor Tesisleri projesi

### 3.1.4. 2017H030025 Nolu Heyelan Önleme Projesi

2018 yılı proje bedeli 35.000.000 TL olan Üniversitemiz stadyum ve açık otopark altı zemin güçlendirme işinin ihaleleri yılsonuna doğru tamamlanmış olup, (KDV hariç) 1.149.000 TL ve 19.741.000 TL bedelli iki ayrı firma ile sözleşmeler imzalanmıştır. Ödeneğinin tamamı likit kaynaklarımızdan karşılanacak olan projeye 2018 yılı içerisinde 24.181.075 TL harcama yapılarak proje tamamlanmıştır.

(BİN)

Proje No	Projenin Adı	Karakteristik	Başlama Bitiş	Proje Tutarı	(A) 2018 Öncesi Toplam Harcama	2018 Kesintili Başlangıç Ödeneği	2018 Revize Toplamı	(B) 2018 Toplam Harcama	(A+B) Toplam Harcama	Proje Gerçekleşme Oranı
2009H031520	Kampüs Altyapı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2009-2020	60.429	53.429	6.000	6.854	6.853	60.282	81-90
2009H031530	Derslik ve Merkezi Birimler	Müh.Fak.Lab.Bin. (20.800 m <sup>2</sup> ), SBMYO (8.000m <sup>2</sup> ), Tobb Teknik Bilimler MYO (6.500 m <sup>2</sup> ), Öğrenci İşleri Mer. Binası (7.800 m <sup>2</sup> )	2009-2020	107.500	4.000	16.798	28.181	27.360	31.360	51-60
2014H050150	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Açık Tenis Kortu (3 adet), Basketbol Sahası (3 adet), Spor Tesisi, Voleybol Sahası (3adet)	2014-2020	23.000	-	6.000	6.000	5.862	5.862	21-30
2017H030025	Heyelan Önleme Projesi	İnşaat Bakım Onarımı	2017-2019	35.000	-	100	24.200	24.181	24.181	91-100
<b>TOPLAM</b>				<b>225.929</b>	<b>57.429</b>	<b>28.898</b>	<b>65.235</b>	<b>64.256</b>	<b>121.685</b>	



## **3.2. Tamamlanan Projeler**

### **3.2.1. 2018H033020 Nolu Yayın Alımı Projesi**

2018 yılı proje bedeli ve başlangıç ödeneği 1.000.000 TL'dir. Yıl içerisinde ek ödenek ihtiyacı hasıl olmuş, likit değerlerimizden 250.000 TL ödenek ilave edilerek proje bedeli ve ödeneği 1.250.000 TL olarak revize edilmiştir. Toplam ödeneğin 1.168.068 TL'si, basılı yayın alımları ve yapımları, elektronik ortamda yayın alımları ve yapımları ile diğer yayın alımları ve yapımlarına harcanmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı %93,45 olarak gerçekleşmiştir.

### **3.2.2. 2018H031490 Nolu Muhtelif İşler Projesi**

2018 yılı proje bedeli ve başlangıç ödeneği 8.000.000 TL'dir. Yeni hizmete alınan eğitim binaları ve mevcut hizmet binalarında yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasından dolayı ek ödenek ihtiyacı hasıl olmuş, likit değerlerimizden 30.868.100 TL ödenek ilave edilerek proje bedeli ve ödeneği 38.868.100 TL olarak revize edilmiştir. Yıl içerisinde proje kapsamında bilgisayar, okul tefrişatı, laboratuvar araç ve gereçleri, makine teçhizat, taşıt, yazılım alımları, Üniversitemiz öğrencilerinin, personelinin ve binalarının güvenliğini sağlamak amacıyla kamera sistemi kurulmasına ilişkin giderler, bakım ve onarım giderleri ile bina büyük onarım giderlerine toplam 38.325.880 TL harcama yapılmış olup, harcamanın toplam ödeneğe oranı %98 olarak gerçekleşmiştir.

### **3.2.3. 2018H033100 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi**

Projenin 2018 yılı toplam ödeneği 1.500.000 TL'dir. Harita hazırlanması, spor tesislerine ait statik hesaba dayalı jeolojik etüt raporu hazırlanması, zemin etüt raporları, geoteknik etüt raporu, Sivil Havacılık Yüksekokulu uçuş eğitim pisti yapılacak alanda imar planı ve revize imar planı hazırlanması, metraj ve keşiflerinin yapılması, yol yapımı uygulama projesi vb proje giderlerine ilişkin 1.370.098 TL tutarında harcama yapılmıştır.

(BİN)

Proje No	Projenin Adı	Karakteristik	Başlama Bitiş	Proje Tutarı	(A) 2018 Öncesi Toplam Harcama	2018 Kesintili Başlangıç Ödeneği	2018 Revize Toplamı	(B) 2018 Toplam Harcama	(A+B) Toplam Harcama	Proje Gerçekleşme Oranı
2018H033020	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2018-2018	1.000	0	1.000	1.250	1.168	1.168	%100
2018H031490	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Taşıt: T-12 (1 adet)	2018-2018	8.000	0	8.000	38.868	38.326	38.326	%100
2018H033100	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Etüt-Proje	2018-2018	100	0	100	1.500	1.370	1.370	%100
<b>TOPLAM</b>				<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>41.618</b>	<b>40.864</b>	<b>40.864</b>	<b>%100</b>

**2018 YILI YATIRIM HARCAMALARI IV. DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME RAPORU**

**Kuruluş Adı : Karabük Üniversitesi**  
**Sektör : Eğitim**

(BİN TL)

Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı Dış	Proje Tutarı Toplam	(A) 2018 Öncesi Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	2018 Yılı Başlangıç Ödeneği (KBÖ) (13)	(+) / (-) (14)	Aktarma Miktarı (15)	(B) 2018 Toplam Harcama (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	(A+B) Harcama Toplamı (18)
254325	491	2009H031520	Kampüs Altyapı*	Özel Bütçe	2009-2020	Karabük	0	60.429	53.429	0	0	6.000	(+)	854	6.853	0	60.282
267354	491	2009H031530	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2009-2020	Karabük	0	107.500	4.000	0	0	16.798	(+)	11.383	27.360	0	28.248
270532	491	2014H050150	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2014-2020	Karabük	0	23.000	0,00	0	0	6.000		0,00	5.862	0	5.862
265170	491	2017H030025	Heyelan Önleme Projesi [14]	Özel Bütçe	2017-2019	Karabük	0	35.000	0,00	0	0	100	(+)	24.100	24.181	0	24.181
244513	491	2018H033020	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2018-2018	Karabük	0	1.000	0,00	0	0	1.000	(+)	250	1.168	0	1.168
244507	491	2018H031490	Muhtelif İşler*	Özel Bütçe	2018-2018	Karabük	0	8.000	0,00	0	0	8.000	(+)	30.868	38.326	0	38.326
244501	491	2018H033100	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2018-2018	Karabük	0	100	0,00	0	0	100	(+)	1.400	1.370	0	1.370
<b>TOPLAM</b>							<b>0,00</b>	<b>235.029</b>	<b>57.429</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.998</b>	<b>0,00</b>	<b>68.855</b>	<b>105.120</b>	<b>0,00</b>	<b>159.437</b>

## 2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

**Kuruluş Adı** : Karabük Üniversitesi  
**Sektör** : Eğitim  
**Bütçe Türü** : Özel Bütçe  
**Dönem** : 4. Dönem (Aralık Sonu)

(BİNTL)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2017 Sonu Kümülatif Harcama			2018 Yılı Program Ödenek			2018Yılı Revize Ödenek			2018Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
EĞİTİM	7		235.059		0	57.429			37.998			106.853			105.120
DİĞER	-		-		0	-			-			-		-	-
TOPLAM	7		235.059		0	57.429			37.998			106.853			105.120
